

**T.C.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ**



**2017 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU**



1. YÖNETİCİ ÖZET

Galatasaray Üniversitesi Atatürk'ün ilkelerine saygılı, araştırmacı, sorgulayıcı, girişimci, çözümlenici, evrensel ve ulusal değerleri özümseyen, mesleki bilgileri üst düzeyde nitelikli bireyler yetiştirmek üzere uygulamalı ve kaliteli eğitim vermeyi temel amaç edinmiştir.

Üniversitemiz bu temel amaçna erişmek için en son teknolojiye makine ve teçhizatla donatılmış, bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı, yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yapıları, harcamaları verimliliğini kontrol etmeleri esas, getirilmiştir.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış, bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim imkanı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki alt yapı, yatırımlarını, bir an önce tamamlamaya çalışmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. maddesi gereğince Sayın Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmek üzere hazırlanan Üniversitemizin 2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulur.

2. GENEL DEĞERLENDİRME

MİSYON

Ulusal ve uluslararası toplumun gelişim ve evrimine katkıda bulunmak için geçmişinden gelen dayanışmacı, özgür ve sorgulayıcı düşünceyi benimseyen, girişimci ruhu destekleyen, etik ve çeşitlilik temelli Galatasaray geleneğini, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneklerle birleştirerek, toplumsal sorumluluk ve evrensel akademik değerlere sahip bireyler yetiştirmektedir.

VİZYON

Bilime katkılarıyla, sosyal sorumluluk girişimleriyle, uluslararası işbirlikleriyle, insanlığın geleceğinde söz sahibi olan mezunlarıyla saygınlık kazanmış bir üniversite olmaktır.

Temel Değerler

- Etik Değerlere Bağlılık,
- Etkinlik,

- Paylaşım,mc,l,k,
- Mükemmeliyetçilik,
- Katılım,mc,l,k,
- Bilimsel Yetkinlik,
- Akademik Özgürlük,
- Farklılıklara Saygı,,
- Toplumsal ve Çevresel Duyarlılık.

3. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇLAR	<u>STRATEJİK HEDEFLER</u>
<u>Stratejik Amaç 1:</u> Eğitim ve öğretim kalitesinin sürekli geliştirilmesi	<u>Hedef 1.1:</u> Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar,na yerleştirilen ve kabul edilen öğrenci niteliğinin sınav başarı puanına göre her yıl yüzde iki oranında arttırılması, <u>Hedef 1.2:</u> Önlisans, lisans ve lisansüstü mezunların mezuniyet not ortalamasının, yıl içinde disiplinlerinin yukarı yönlü bir trend izlemesi <u>Hedef 1.3:</u> Önlisans, lisans ve lisansüstü programlardan normal sürede mezun olan öğrenci sayısının her yıl yüzde bir oranında arttırılması, <u>Hedef 1.4:</u> Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim veren akademik personelin performans göstergeleri temel alınarak yapılan değerlendirmelerinin olumlu yönde bir değişim izlemesi

	<p><u>Hedef 1.5:</u> Ulusal ve uluslararası, yeterlilikler çerçevesi uyumlu t,rma süreçlerinin 2017 y,l, sonuna kadar tamamlanmas,, izlenmesi ve de erlendirilmesi ile sürekli iyile menin sa lanmas,</p> <p><u>Hedef 1.6:</u> Lisans ve lisansüstü programlar,n,n seçmeli derslerinde 2017 y,l, sonuna kadar ngilizce e itim dilinin yüzde yirmi oran,nda yayg,nla t,r,lmas,</p>
<p><u>Stratejik Amaç 2:</u> Bilimsel ara t,rma, yay,n ve etkinliklerin art,r,lmas,</p>	<p><u>Hedef 2.1:</u> Ö retim üyesi ba ,na dü en uluslararası, indeksler taraf,ndan taranan dergilerde yay,mıanm, makale say,s,n,n her y,l yüzde be oran,nda art,r,lmas,</p> <p><u>Hedef 2.2:</u> Ö retim üyesi ba ,na dü en toplam yay,n ve bilimsel faaliyetlerin (makale, kongre, konferans bildirileri vb.) say,s,n,n her y,l yüzde on oran,nda art,r,lmas,</p> <p><u>Hedef 2.3:</u> Ö retim üyesi ba ,na dü en at,f say,s,n,n her y,l yüzde be oran,nda art,r,lmas,</p> <p><u>Hedef 2.4:</u> Galatasaray Üniversitesi taraf,ndan düzenlenen ulusal ve uluslararası, bilimsel konferans, seminer, panel, kolokyum vb. faaliyetlerin her y,l yüzde on oran,nda art,r,lmas,</p> <p><u>Hedef 2.5:</u> Ö retim üyesi ba ,na dü en TÜB TAK ve di er kamu finansl, projelerin say,s,n,n (de erlendirme y,l, içinde tamamlanan) her y,l yüzde be oran,nda art,r,lmas,</p>

<p><u>Stratejik Amaç 3:</u> Üniversitenin sürdürülebilir gelişimini temin etmek amacıyla kaynakların geliştirilmesi ve etkin olarak kullanılması,</p>	<p><u>Hedef 3.1:</u> Akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilişim otomasyon hizmetlerindeki memnuniyet düzeyinin iyileştirilmesi</p> <p><u>Hedef 3.2:</u> Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının kütüphane hizmetlerindeki memnuniyet düzeyinin artırılması,</p> <p><u>Hedef 3.3:</u> Üniversitede 2017 yılı sonuna kadar çevreye duyarlı kampüs yönetimine geçilmesi</p> <p><u>Hedef 3.4:</u> Akademik personel başına düşen araştırma geliştirme proje desteklerinin ve döner sermaye gelirlerinin her yıl yüzde on oranında artırılması,</p>
<p><u>Stratejik Amaç 4:</u> Kurumsallaşma, kaliteli yönetim anlayışının Üniversitenin tüm süreçlerinde uygulanması,</p>	<p><u>Hedef 4.1:</u> Toplam kalite anlayışının çerçevesinde Üniversite kalite güvence sisteminin 2017 yılı sonuna kadar tüm süreçlerde oluşturulması,</p>
<p><u>Stratejik Amaç 5:</u> Yaşam boyu eğitim programlarının güçlendirilerek toplumsal sorumluluk duyarlılığının sağlanması,</p>	<p><u>Hedef 5.1:</u> Sürekli Eğitim Merkezinde açılan program sayısının her yıl yüzde on oranında artırılması,</p> <p><u>Hedef 5.2:</u> Üniversite genelinde proje bazlı toplumsal sorumluluk ve sosyal girişimcilik çalışmalarını ile faaliyetlerinin her yıl yüzde beş oranında artırılması,</p>
<p><u>Stratejik Amaç 6:</u> Paydaşlarla olan iletişim, etkileşim ve işbirliğinin geliştirilmesi</p>	<p><u>Hedef 6.1:</u> Çeşitli paydaşların memnuniyet düzeyinin her yıl yüzde beş oranında artırılması,</p>

4. KURULU YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI:

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanunla ekli II Sayılı Özel Bütçeli daireler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, öz bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

- A) Özel Bütçe
 - a) Hazine Yardımı,
 - b) Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri (Lojman, kantin vb.)
 - 2) İkinci Ödeme Gelirleri
 - 3) Örgün Ödeme Gelirleri
 - 4) Ödeme teklifi Giderleri
 - 5) Araştırma Projeleri Gelirleri Payı,
 - 6) Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
- B) Döner Sermaye
- C) Bütçe Dışı Kaynak
 - a) TÜBİTAK
 - b) AB
 - c) Erasmus
 - d) Sentez Projeleri
 - e) Mevlana

5. KURULUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI:


Anayasanın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin parasız olmasıyla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamasıyla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun halen yürürlükte olan 38 inci maddesinde yükseköğretim parasızlığı hükmü yer almaktadır.

2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynakları, diğer yıla bütçeye konulacak ödenekler, 46 nci maddesine göre, cari hizmet maliyetine ödenecek katkı, ile yükseköğretim kurumları, önceki yıllarda basılan süreli ya da süresiz yayınlar ile elektronik ortamda veya internet ortamında sunulan ders elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumları, İkinci Ödeme Yapılması... Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretim bitimini takiben yapılan ikinci ödeme katkı, pay, gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılatın %5'inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim

kurumlar, ad,na tapuda kay,tl, ta ,nmazlar,n kiralanmas,, sat,lmas, ve i letilmesi, hazine ad,na kay,tl, olup yüksekö retim kurumlar,na tahsisli ta ,nmazlar,n e itim, sa lık ve sosyal amaçlı, kiralanmas, ve i letilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 say,l, yasan,n Ek 27 nci maddesi ile aç,lan tezsiz yüksek lisans programlar, ö retim ücreti gelirleri, 2547 say,l, yasan,n 43 üncü maddesinin (d) bendi gere i öYüksekö retim kurumlar,, yurt d ,ndaki yüksekö retim kurumlar, ve di er kurulu larla i birli i tesis ederek ön lisans ve lisans programlar, da dahil olmak üzere uluslararası, ortak e itim ve ö retim programlar, yürütülmesiö için bu e itim ve ö retim programlar,na kay,tl, ö rencilerden al,nacak ö renim gelirleri, say,labilir.

6. ÜN VERS TEM Z 2017 YILI 06. SERMAYE G DERLER EKONOM K KODLU ÖDENEK DA İLİMLARI VE ORANLARI

2017 YILI YATIRIM HARCAMALARININ BÜTÇE ÖDENEK DAĞILIMLARI						
	Başlangıç ödeneđi	Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek	Gerçekleşen Harcama Toplamı	Gerçekleşme Oranı
06. SERMAYE GİDERLERİ	22.500.000,00	12.488.000,00	1.270.000,00	33.718.000,00	22.754.608,78	0,68
06.1 Mamul Mal Alımı	2.121.000,00	950.000,00	0,00	3.071.000,00	2.940.877,40	0,96
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	300.000,00	608.000,00	0,00	908.000,00	890.390,73	0,98
06.4 Kamulaştırma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	4.048.000,00	400.000,00	870.000,00	3.578.000,00	2.969.765,00	0,83
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	16.029.000,00	10.530.000,00	400.000,00	26.159.000,00	15.953.575,65	0,61

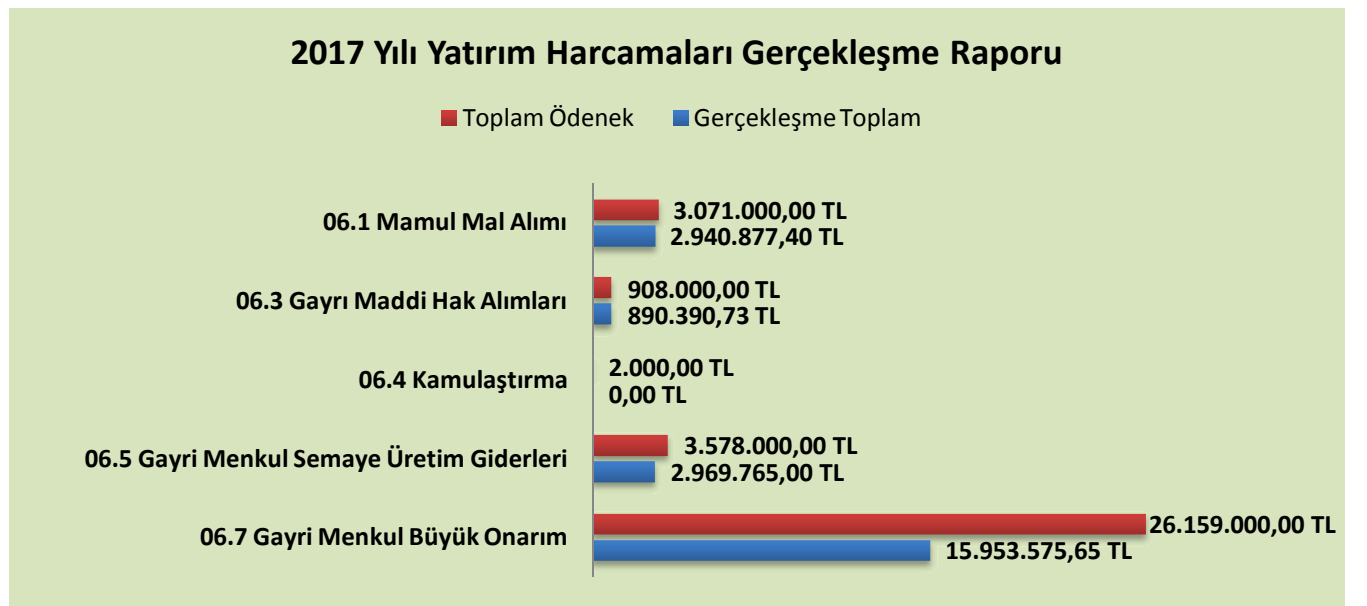


2017 YILI BÜTÇE GERÇEKLEME RAPORU


	Bütçe Ödeneği	Toplam Ödenek	Kesin Harcama	Kalan Ödenek	Gerçekleşme Oranı
01 - Personel Gideri	39.038.000,00	40.886.788,00	38.382.475,00	2.504.313,00	0,94
02 - Sos.Güv.Kur.D.Prim Giderleri	5.919.000,00	5.919.000,00	5.554.157,00	364.843,00	0,94
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.158.000,00	18.710.292,00	17.814.163,00	896.129,00	0,95
05 - Cari Transferler	2.457.000,00	2.457.000,00	2.354.631,00	102.719,00	0,96
06 - Sermaye Giderleri	22.500.000,00	33.718.000,00	22.754.608,00	10.963.392,00	0,68
Toplam	86.072.000,00	101.691.430,00	86.860.034,00	14.831.396,00	0,85

BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN GİDER KALEMLERİNE DAĞILIMI

BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN GİDER KALEMLERİNE DAĞILIMI



SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE ÖDENEĞİNİN TOPLAM BÜTÇE ÖDENEKLERİ İÇİNDEKİ PAYI

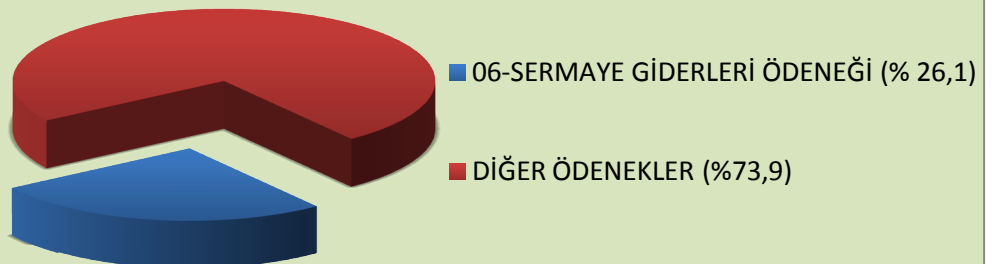

7. KURULU UN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

ORTAKÖY KAMPÜS ALANI 2017 YILI FİZİKSEL KAPALI ALANLAR (M ²)										
Birimler	Bina Alanları,	Eğitim Alanları,		Sosyal Alanlar				Spor Alanları,		Toplam
		Derslik	Laboratuvar	Y.hane	Lojman	Yurtlar	Garaj	Açık	Kapalı	
Rektörlük	13877		0	407	0	0	0	0	0	14.284
Fakülteler	3.619	3.997	797	0	0	0	0	0	0	8.413
Yüksekokullar	63	190	0	0	0	0	0	0	0	253
Enstitüler	266	273	15	0	0	0	0	0	0	554
Kütüphane	214	1.813	0	0	0	0	0	0	0	2.027
Sosyal Tesisler	0	0	0	419	0	0	0	0	0	419
Atölye-Depo	1.077	0	0	0	0	0	0	0	0	1.077
TOPLAM	19.116	6.273	812	826	0	0	0	0	0	27.027

ENSTİTÜ, FAKÜLTE, MYO, VE TÜM BİRİMLER	MEVCUT FİZİKSEL ALANLAR m ²									
	DAR BİNALAR	EĞİTİM ALANLARI		SOSYAL ALANLAR			SPOR ALANLARI			TOPLAM
		DERSLİK	LABORATUVAR	KANTİN	LOJMAN	YATAKHANE	SERKÜLASYON ALANI	AÇIK SPOR TESİSLERİ	KAPALI SPOR TESİSLERİ	
ORTAKÖY KAMPÜSÜ	16421,00	6.273	812	826	-	-	2.695	-	-	27.027,02
BEYOĞLU KAMPÜSÜ	12.611,20	6.000	960	326	624	2.573,80	6.000	(4.865)	1638	30.733,00
SİĞİRCI KAMPÜSÜ	825,50	816	48	10,50	-	-	200	-	100	2.000,00
LİSE VE BAĞIÇCI KAMPÜSÜ	1.750,00	4.900	800	1.650			11.550		5.850	26.500,00
TOPLAM	31.607,70	17.989	2.620	2812,5	624	2.573,80	20.445	(4.865)	7.588	86.260,02

Üniversitemiz Beyoğlu Yerleşkesi (Galatasaray Lisesi) haricinde yukarıdaki tabloda belirtilen alanlarda; 506 m²'lik "Galatasaray Müzesi" bulunmaktadır.

6 Haziran 1994 tarihli ve 21952 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı Kanununun 5. maddesinin geçici 29. maddesinde, "Galatasaray Lisesi'ne ayrılmış bulunan taşınmaz ve taşınmaz mallar Galatasaray Üniversitesi'ne devredilmiştir" hükmü yer almaktadır. Bu nedenle tüm bakım ve onarımları ile yeni inşaatlara ait yatırımlar üniversite

2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

bütçesinden harcanmaktadır.

Galatasaray Üniversitesi'nin diğer fiziksel değerleri a a ,da gösterilmiştir.

Galatasaray Üniversitesi Derslik Sayısı : 119

Taahhüt araç sayısı : 7'dir.

Hizmet satın alma yolu ile 3 adet araç kiralanmıştır.

Galatasaray Üniversitesi 2017 Yılı Sonu Mevcut Taahhüt Listesi

Sıra No.	Taahhüt Cinsi	Plaka	Modeli	Marka	Sayı			
					Bütçe	Döner Sermaye	Fon	Hibe
1	B NEK	34 GSU 98	2008	RENAULT	1			
2	B NEK	34 GS 0954	2008	RENAULT	1			
3	AMBULANS	34 GS 0516	2009	BMC	1			
4	B NEK	34 GS 0292	2015	FAT	1			
5	M N BÜS	34 TA 5385	2015	FORD				1
6	M N BÜS	34 GD 0614	2015	KARSAN				1
7	B NEK	34 BU 1671	2017	RENAULT	1			
TOPLAM					5	0	0	2

Galatasaray Üniversitesi 2017 Yılı Sonu Hurdaya Ayrılan Taahhüt Listesi

Sıra No.	Taahhüt Cinsi	Plaka	Modeli	Marka	Sayı			
					Bütçe	Döner Sermaye	Fon	Hibe
1	M N BÜS	34 TE 124	2001	PEUGEOT	1			
1	B NEK	34 AE 7980	1999	TPO	1			
TOPLAM					2	0	0	0

Üniversitemizde, Maliye Bakanlığı, e-bütçe sistemi kullanılmaktadır. Ödemelerde Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün say2000i sistemi ile KBS sistemi kullanılarak kurumumuz personeli maaş ödemeleri ve diğer ödemeler yapılmaktadır. Ayrıca yatırımların projeleri ve harcamaları da elektronik ortamda takip edilmektedir.

8. 2017 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLE EN KAPAS TE ARTI I

Üniversitemiz yerle kelerinde yap,lan çal, malar projelendirme, bak,m, onar,m ve restorasyon niteli inde olup mekanlar,m,z,n mevcut mevzuatlar çerçevesinde iyile tirilmesi yap,lmaktad,r.

Be ikta lçesi; Y,ld,z Mahallesi, Ç,ra an Caddesi 65 pafta, 575 ada, 37 parselde yer alan Galatasaray Üniversitesi Tevfik Efendi Sahil Saray, ile ilgili olarak stanbul III Numaral, Kültür Varl,klar,n, Koruma Bölge Kurulunun onay, ile restorasyon uygulama çal, malar,na ba lanm, t,r.

Ortaköy Yerle kesi Rektörlük, Yabanc, Diller ve Sosyal Bilimler Binalar, Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, n aat, Mühendislik, Makina Mühendisli i, Elektrik Mühendisli i projeleri haz,rlanarak stanbul III Numaral, Kültür ve Tabiat Varl,klar,n, Koruma Bölge Kurulu onay,na sunulmu tur.

2017 y,l,nda a a ,da belirtilen i lerin ihalesi yap,l,p, bütünüyle tamamlanm, t,r;

- GSÜ Ortaköy ve Beyo lu Yerle keleri Muhtelif Onar,m,lar, ile Ç,ra an Caddesi Duvar, Restorasyonu i.
- GSÜ Ortaköy Yerle kesi Tarihi Yap,lar,n Çat, Onar,m,, Muhtelif Tadilat Ve Tesisat Sistemlerinin Yap,m, i.
- GSÜ Ortaköy, Beyo lu, i li Yerle keleri Acil Onar,m leri
- GSÜ Ortaköy Yerle kesi Kültür Merkezi Binas, Giri i Muhtelif Onar,m leri
- GSÜ Beyo lu Yerle kesi Ö renci Yatakhane Kat, Boya Yap,lm,as, i
- GSÜ Rektörlük Binas, So utma Sisteminin Yenilenmesi i
- GSÜ Ortaköy Yerle kesi Çe itli Mekanlar,n Acil Tesisat ve Onar,m leri
- GSÜ Ortaköy Yerle kesi Muhtelif Islak Hacimlerin Projelerinin Haz,rlanmas, i
- GSÜ Ortaköy Yerle kesi Ç,ra an Caddesine Paralel Tarihi Duvarlar,n Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Haz,rlanmas, i.
- GSÜ Beyo lu Yerle kesi Ana Bina 2. Kat Islak Hacimlerin Mimari, Mekanik ve Elektrik Tesisat Projelerinin Haz,rlanmas, i
- GSÜ Ortaköy Yerle kesi Yi it Okur Binas, Elektrik ve Mekanik Tesisatlar,n,n Uygulama Projelerinin Haz,rlanmas, leri yapt,r,lm, t,r.
- GSÜ Ortaköy Yerle kesi Felaket Kurtarma Merkezi, Yüksek Ba ar,ml, Hesaplama Merkezi ve Say,sal Bilgilendirme-Yönlendirme Sistemi Altyap, Kurulumu i yapt,r,lm, t,r.

9. 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

Genel Yat,r,m Uygulama Durumu :

Üniversitemizin 2017 y,l,nda toplam 6 adet yat,r,m projesi mevcuttur.

- 1- 1996H030460 Derslik ve Merkezi Birimler (Üniversite, lkö retim Okulu ve Lise Yerle kesinin ve in aat i lerini projelerinin yap,lm,as,)
- 2- 2017H030730 Çe itli Ünitelerin Etüd Projesi (Üniversite, lkö retim Okulu ve Lise Yerle kelerinin rölöve, restitüsyon, restorasyon, mühendislik ve mimarlık projelerinin yap,lm,as,)

- 3- 2013H0301020 Kampüs Altyapı, Projesi (Üniversite Yerleşkesinin bilgisayar ağı, altyapı, kanal, elektrik, su, çevre düzenleme, doğalgaz, yol, iş, merk. art. trafo, telefon ve çevre güvenlik işleri)
- 4- 2017H030740 Muhtelif İşler Projesi (Üniversite, İlköğretim Okulu ve Lise Yerleşkesinin büyük onarımları - bilgisayar, makine ve teçhizat alımları, ve bilgisayar yazılım alımları)
- 5- 2017H030750 Yayın Alımı, (sürekli ve süresiz yayınlar ve elektronik kitap yayınları)
- 6- 2017H040060 Feriye Sarayı, Restorasyonu

2017 yılında Üniversitemiz yatırım programında yer alan projelerin toplam projeye tutarı, 22.500.000,00 TL'dir. (06 Sermaye Giderleri) Yılı içerisinde 11.218.000,00 likit Karşılık, ödenek eklenerek genel toplamda 33.718.000,00 TL olarak gerçekleştirilmiştir. Bu ödeneğin 22.754.608,78 TL'dir.

2017H030740 proje nolu Muhtelif İşler ödeneğine 150.000,00 TL Likit karşılık, ödenek eklenmiştir. (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 06.1 Mal Mamul Alımları ödenek tertibine)

2017H030740 proje nolu Muhtelif İşler ödeneğine 238.000,00 TL Likit karşılık, ödenek eklenmiştir. (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları ödenek tertibine)

2017H030740 proje nolu Muhtelif İşler ödeneğine 300.000,00 TL Likit karşılık, ödenek eklenmiştir. (Savunma Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 06.1 Mal Mamul Alımları ödenek tertibine)

2017H030740 proje nolu Muhtelif İşler ödeneğine 10.530.000,00 TL Likit karşılık, ödenek eklenmiştir. (Yapı ve Teknik İşleri Daire Başkanlığı 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarımlar Giderleri ödenek tertibine)

2013H0301020 Kampüs Altyapı, Projesi ödeneğinden 2017H030740 proje nolu Muhtelif İşler ödeneğine 870.000,00 TL aktarma yapılmıştır. (Yapı ve Teknik Daire Başkanlığı, 06.7 ödenek tertibinden, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 06.1 ve 06.3 ödenek tertibine yapılan aktarma)

Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar :

Üniversitemiz Ortaköy ve Beyoğlu (Galatasaray Lisesi) Yerleşkesinde bulunan binaların tarihi eser niteliğinde olup, restorasyon çalışmaları için gerekli izin ve bürokratik işlemlerden kaynaklanan gecikmeler yaşanmaktadır. Bu da yıllık hedeflerimizin özellikle Etüt Proje ve Muhtelif İşler kapsamında sağlanma yoluna açılmaktadır. Ödeneklerin yıl içinde dağıtım yaparken

10. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI

2017H030730 Çe itli Ünitelerin Etüd Projesi : Proje Tutar, 98.000,00 TL' d,r. 2017 y,l, Ba lang,ç ödene i 98.000,00 TL olup y,l içerisinde 2017H030740 Muhtelif ler Projesinden 400.000,00 TL revize (Ekleme) yap,lm, t,r. Proje kapsam,nda toplam 322.140,00 TL harcama yap,lm, t,r.

1996H030460 Derslik ve Merkezi Birimler : Proje Tutar, 68.000.000,00 TL' d,r. 2017 y,l, Ba lang,ç ödene i 200.000,00 TL olup, proje kapsam,nda harcama yap,lmam, t,r.

Galatasaray E itim Vakf,na ba , lanan ve 49 y,l müddetle Galatasaray Üniversitesine irtifak hakk, (ba lama tarihi 31.03.2003) verilen Bahçe ehir Yerle kesi parsellerin üzerinde yap,lmakta olan Yönetim Binas, Yap,m inin i program,, Galatasaray E itim Vakf,na ba , ç,s, taraf,ndan aç,lan dava nedeniyle 2017 y,l,nda gerçekte tirilememi tir.

2013H031020 Kampüs Altyap,s, : Proje Tutar, 9.750.000,00 TL' d,r. 2017 y,l, Ba lang,ç ödene i 3.750.000,00 TL olup y,l içerisinde 2017H030740 Muhtelif ler Projesine 870.000,00 TL revize (Dü ülen) yap,lm, t,r. Proje kapsam,nda toplam 2.647.625,00 TL harcama yap,lm, t,r.


2017H030740 Muhtelif ler : Proje Tutar, 7.600.000,00 TL' d,r. 2017 y,l, Ba lang,ç ödene i 7.600.000,00 TL' d,r. Y,l içerisinde 2017H030740 Muhtelif ler Projesinden 400.000,00 TL revize (Dü ülen) ve 2013H031020 Kampüs Altyap,s, Projesinden 870.000,00 TL revize (Eklenen) yap,lm, ayr,ca Likit kar ,l, , 11.218.000,00 TL ödenek eklenmi tir. Genel Toplamda 19.288.000,00 TL olup proje kapsam,nda 18.985.533,21 TL harcama yap,lm, t,r.

2017H030750 Yay,n Al,m : Proje Tutar, 850.000,00 TL' d,r. 2017 y,l, Ba lang,ç ödene i 850.000,00 TL. olup proje kapsam,nda 799.310,57 TL harcama yap,lm, t,r.

2017H040060 Feriye Saraylar, Restorasyonu : Proje Tutar, 25.000.000,00 TL' d,r. 2017 y,l, Ba lang,ç ödene i 10.000.000,00 TL olup, proje kapsam,nda harcama yap,lmam, t,r.

Ortaköy Yerle kesi brahim Tevfik Efendi Sahil Saray, Güçlendirme, S,va, Ah ap ve Muhtelif Restorasyon Uygulama lerinin ihalesi yap,lm, olup i e ba lan,lm, t,r.

2017 Yılı, Kamu Yatırımları, Proje Bazında Harcama Raporu

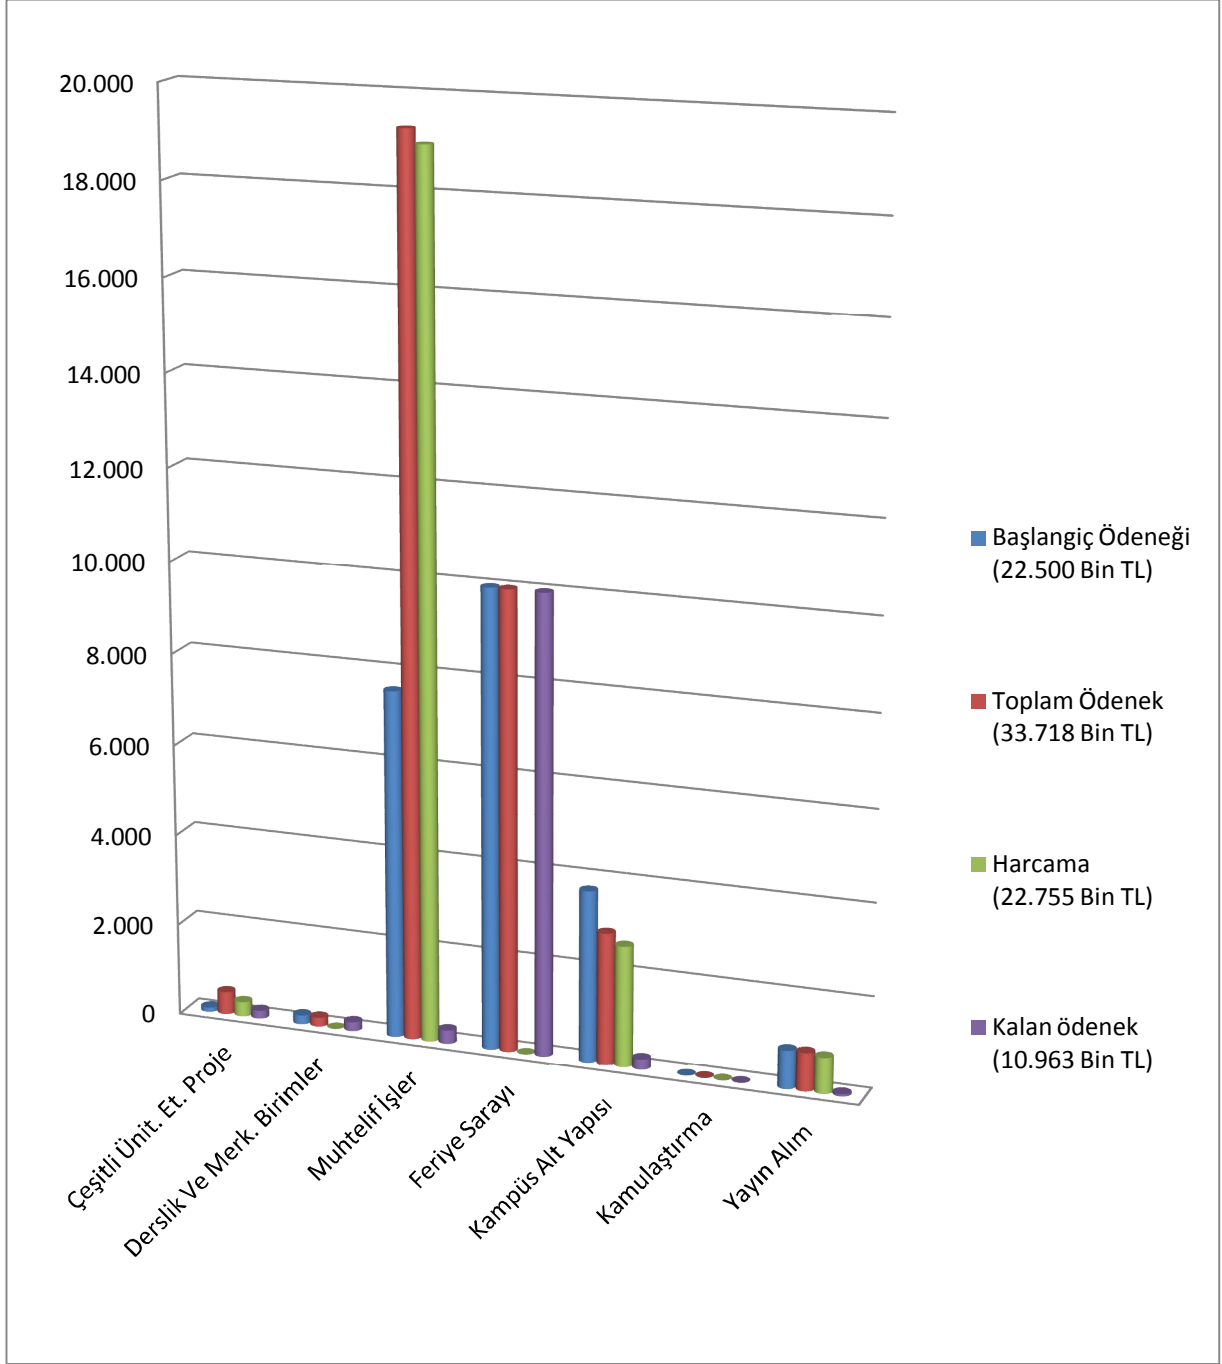

2017 YILI PPROJE G DERLER

- **2017H030730 Çe itli Ünitelerin Etüd Projesi** : Proje Tutar, 98.000,00 TL' d,r. 2017 y,l, Ba lang,ç ödene i 98.000,00 TL olup y,l içerisinde 2017H030740 Muhtelif ler Projesinden 400.000,00 TL revize (Ekleme) yap,lm, t,r. Proje kapsam,nda toplam 322.140,00 TL harcama gerçekte mi tir.

BA LAMA VE B T TAR H	YAPILAN N ADI	AÇIKLAMA (2017 Y,l,nda Tamamlanan lerle Nelerin Gerçekle tirildi i, Tamamlanmas, Programlanan Ancak Tamamlanamayan lerin Tamamlanamama Nedenleri Hakk,nda)	PROJEN N		2017 YILI YATIRIMLARINDA		
			TOPLAM BÜYÜKLÜ Ü	MEVCUT F Z K DURUMU (2017 ÖNCES)	F Z K GERÇEKLE ME		HARCAMA TUTARI (TL)
					HEDFLN. M K TAR	GERÇKL M K TAR	
2016- 2018	GSÜ Ortaköy Yerle kes i Rek.Yabanc, Dil.ve Sosyal Bil.Binalar, Rölöve, Restitüsyon, Rest. n .Müh.Makina Müh.Elekt.r.Müh.Proje Haz.i i	Rektörlük, Sosyal Bilimler ve Yabancı, Diller Binalar,n,n rölöve ve restitüsyon projeleri stanbul III Numaral, Kültür ve Tabiat Varlıklar,n, Koruma Bölge Kurulu taraf,ndan onaylanm, olup restitüsyon ve restorasyon projeleri de onay a mas,ndadır					203.550,00
2017	GSÜ Ortaköy Yerle kes i Muhtelif Islak Hacimlerin Projelerinin Haz,rlanmas, i	Ortaköy Yerle kesinde bulunan binalar,m,zdaki muhtelif ,slak hacimlerin ihtiyaca göre mimari, mekanik ve elektrik tesisat projeleri haz,rlanm, t,r					65.490,00
2017	GSÜ Ortaköy Yerle kes i Ç,ra an Caddesine Paralel Tarihi Duvarlar,n Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Haz,rlanmas, i	Ortaköy Yerle kes i Ç,ra an Caddesine paralel tescilli tarihi duvarlar,n rölöve, restitüsyon ve Restorasyon projeleri haz,rlan- m, t,r.					53.100,00
TOPLAM			0	0	0	0	322.140,00

2017 YILI PPROJE G DERLER

- **1996H030460 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi**: Proje Tutar, 200.000,00 TL' d,r. 2017 y,l, Ba lang,ç ödene i 200.000,00 TL olup proje kapsam,nda harcama yap,lmam, t,r.

BA LAMA VE B T TAR H	YAPILAN N ADI	AÇIKLAMA (2017 Y,l,nda Tamamlanan lerle Nelerin Gerçekle tirildi i, Tamamlanmas, Programlanan Ancak Tamamlanamayan lerin Tamamlanamama Nedenleri Hakk,nda)	PROJEN N		2017 YILI YATIRIMLARINDA		
			TOPLAM BÜYÜKLÜ Ü	MEVCUT F Z K DURUMU (2017 ÖNCES)	F Z K GERÇEKLE ME		HARCAMA TUTARI (TL)
					HEDFLN. M K TAR	GERÇKL M K TAR	
1996 - 2017	Derslik ve Merkezi Birimler (Yönetim Binas,)	Galatasaray E itim Vakf,na ba , lanan ve 49 y,l müddetle Galatasaray Üniversitesine irtifak hakk, (ba lama tarihi 31.03.2003) verilen Bahçe ehir Yerle kes i parsellerin üzerinde yap,lmakta olan Yönetim Binas, Yap,m inin i program, ve yap,lmam, hedeflenen çevre düzenlemesi ve alt yap, çal, malar, da Galatasaray E itim Vakf,na ba , ç,s, taraf,ndan aç,lan dava nedeniyle 2017 y,l,nda gerçekle tirilememi tir	2800m ²	2500m ²	2800m ²	0	0,00
TOPLAM							

2017 YILI PROJE GİDERLERİ

- **2013H031020 Kampüs Altyapısı** : Proje Tutarı, 3.750.000,00 TL'dir. 2017 yılında, Başlangıç ödeneği 3.750.000,00 TL olup proje kapsamında 2.647.625,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

BAĞLAMA VE BİTİRİMLER	YAPILAN İNŞAATI	AÇIKLAMA (2017 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanmayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJE NO		2017 YILI YATIRIMLARINDA		
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT F Z K DURUMU (2017 ÖNCESİ)	F Z K GERÇEKLEME		HARCAMA TUTARI (TL)
					HEDFLEN. MİKTAR	GERÇEKLE MİKTAR	
2013 -2017	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Felaket Kurtarma Merkezi, Yüksek Başarımlı, Hesaplama Merkezi ve Sayısal Bilgilendirme-Yönlendirme Sistemi Altyapı Kurulumu						2.581.545,00
2017 -2017	GSÜ Beyoğlu Yerleşkesi Ana Bina 2. Kat Islak Hacimlerin Mimari, Mekanik ve Elektrik Tesisat Projelerinin Hazırlanması	Beyoğlu Yerleşkesinde bulunan Galatasaray Lisesi ana binasının yatakhane katındaki ıslak hacimlerin mimari, mekanik ve elektrik tesisat projeleri hazırlanmıştır.					66.080,00
		TOPLAM					2.647.625,00

2017 YILI PROJE G DERLER

- **2017H030740 Muhtelif ler** : Proje Tutar, 7.600.000,00 TL' d,r. 2017 y,l, Ba lang,ç ödene i 7.600.000,00 TL' d,r. Y,l içerisinde 2017H030730 Çe itli Ünitelerin Etüd Projesine 400.000,00 TL revize (Dü ülen) ve 2013H031020 Kampüs Altyap,s, Projesinden 870.000,00 TL revize (Eklenen) yap,lm, ayr,ca Likit kar ,l, , 11.218.000,00 TL ödenek eklenmi tir. Genel Toplamda 19.288.000,00 TL olup proje kapsam,nda 18.985.533,21 TL harcama gerçekte mi tir.

1) 2017H030740 Muhtelif ler (Büyük Onar,m - Hizmet Binas,)

BA LAMA VE B T TAR H	YAPILAN N ADI	AÇIKLAMA (2017 Y,l,nda Tamamlanan lerle Nelerin Gerçekle tirildi i, Tamamlanmas, Programlanan Ancak Tamamlanamayan lerin Tamamlanamama Nedenleri Hakk,nda)	PROJEN N		2017 YILI YATIRIMLARINDA		
			TOPLAM BÜYÜKLÜ Ü	MEVCUT F Z K DURUMU (2017 ÖNCES)	F Z K GERÇEKLE ME		HARCAMA TUTARI (TL)
					HEDFLN. M KTAR	GERÇKL M KTAR	
2017-2017	GSÜ Ortaköy ve Beyo lu Yerle keleri Muhtelif Onar,m,lar, ile Ç,ra an Caddesi Duvar, Restorasyonu i i.	Ortaköy ve Beyo lu Yerle kelerinde bulunan a ,r,l,kl, olarak ö rencilerimizin kulland,klar, binalar,n ihtiyaca ve yeni mevzuatlara uygun onar,m,lar, yap,lm, t,r					9.446.531,47
2017-2017	GSÜ Ortaköy Yerle kes i Tarihi Yap,lar,n Çat, Onar,m,, Muhtelif Tadilat Ve Tesisat Sistemlerinin Yap,m, i	Ortaköy Yerle kesinde tarihi binalar,m,z,n çat, ve tesisat sistemlerinin muhtelif tadilatlar, Yap,lm, t,r.					5.683.994,18
2017-2017	GSÜ Ortaköy Yerle kes i Yi it Okur Binas, Elektrik ve Mekanik Tesisatlar,n,n Uygulama Proj. Haz,r,lanmas, leri yapt,r,lm, t,r	Ortaköy Yerle kes i Yi it Okur binas,n,n ihtiyaca göre elektrik ve mekanik tesisatlar,n,n uygulama projeleri haz,r,lanm, t,r.					59.000,00
2017-2017	GSÜ Ortaköy, Beyo lu, i li Yerle keleri Acil Onar,m leri	Ortaköy, Beyo lu ve i li Yerle kelerinde stanbul'da ya anan ya mur ve dolu felaketlerinden dolayı, a ,r hasar gören binalar,m,z,da acil onar,m,lar, yap,lm, t,r.					521.560,00
2017-2017	GSÜ Ortaköy Yerle kes i Kültür Merkezi Binas, Giri i Muhtelif Onar,m leri	Ortaköy Yerle kes i Kültür Merkezi binas, giri inin onar,m i leri yap,lm, t,r.					64.900,00
2017-2017	GSÜ Beyo lu Yerle kes i Ö renci Yatakhane Kat, Boya Yap,lm,as, i	Beyo luYerle kesinde Galatasaray Lisesi ana binas,nda bulunan yatakhane kat,ndaki boya i leri yap,lm, t,r.					59.000,00
2017-2017	GSÜ Rektörlük Binas, So utma Sisteminin Yenilenmesi i	Rektörlük binas,n,n ar,zalanan so utma sistemi yenilenmi tir.					66.670,00
2017-2017	GSÜ Ortaköy Yerle kes i Çe itli Mekanlar,n Acil Tesisat ve Onar,m leri	Ortaköy Yerle kesinde çe itli mekanlardaki tesisatlarda olu an ar,zalar e itim ö retim aksat,lmadan onar,lm, t,r.					51.920,00
		TOPLAM					15.953.575,65

2) 2017H030740 Muhtelif ler (Büro Makinalar, Al,m,)

BA LAMA VE B T TAR H	YAPILAN N ADI	2017 YILI YATIRIMLARINDA		
		F Z K GERÇEKLE ME		HARCAMA TUTARI
		HEDEF. M KTAR	GERÇEK. M KTAR	
2017-2017	Üniversite giri ç,k, güvelik için bariyer al,mlar, ve kamere kay,t cihaz, al,m i i	% 100	% 100	185.498,69
2017-2017	Bilgi i leme Sanal Denetleyici al,m, (Acces Point) i i	% 100	% 100	37.922,49
2017-2017	Yaz, Tahtas, al,m,	% 100	% 100	47.790,00
2017-2017	Hukuk Fakültesi s,n,flar,nda kullan,lmak üzere klima al,nmas, i i	% 100	% 100	30.353,06
2017-2017	Bilgi lem Sistem odas,nda Kullan,lmak üzere Klima al,m, i i	% 100	% 100	18.500,04
2017-2017	Büro Mefru at ve Büro Makinesi Al,mlar,	% 100	% 100	111.597,68
2017-2017	Mühendislik fakültesi laboratuar al,m, i i	% 100	% 100	31.909,68
2017-2017	Dersliklerde kullan,lmak üzere Projeksiyon al,m, i i	% 100	% 100	413.433,13
2017-2017	Güvenlik kameras, al,m, i i	% 100	% 100	25.860,50
2017-2017	IDM Üç boyutlu yaz,c, al,m, i i	% 100	% 100	13.351,70
2017-2017	Bilgi i lem sunucular,na hard disk al,m, i i	% 100	% 100	19.502,99
2017-2017	CNC Freze ve torna tezgah,	% 100	% 100	285.667,91
2017-2017	Büro makinalar, al,m, ve Paslanmaz Çöp kova al,m, i i	% 100	% 100	8.723,15
TOPLAM				1.230.111,02

3) 2017H030740 Muhtelif ler (Bilgisayar Yazılım Alımları)

BA LAMA VE B T TAR H	YAPILAN İN ADI	2017 YILI YATIRIMLARINDA		
		F Z K GERÇEKLE ME		HARCAMA TUTARI
		HEDEF. M K TAR	GERÇEK. M K TAR	
2017-2017	2017 y,İ, Microsoft Lisans al,m,	% 100	% 100	117.254,24
2017-2017	Güvenlik Duvar, Checkpoint 12400 Lisans al,m,	% 100	% 100	125.316,00
2017-2017	Adobe Creative Cloud 20 kullan,c, lisans al,m,	% 100	% 100	22.833,00
2017-2017	Ar iv Yönetim Sistemi Yaz,İ,m,	% 100	% 100	51.920,00
2017-2017	CNC Freze ve Torna Tezgah, CIM sistem yaz,İ,m al,m,	% 100	% 100	8.723,76
2017-2017	Galatasaray Lisesi ve İlk-Ö retim için internet güvenli i amaç,yla Cybreroam marka CR750ia model güvenlik duvar, lisans al,m,	% 100	% 100	55.814,00
2017-2017	GSU Ortaköy Yerle kesi Felaket Kurtarma Merkezi Yüksek Ba ar,ml, Hesaplama Merkezi ve Say,sal Bilgilendirme Yönlendirme Sistemi al,m,	% 100	% 100	484.976,93
2017-2017	Üniversitemizde kablosuz internet hizmeti sunan Aruba 7205 kontrol sistemi yenileme	% 100	% 100	23.552,80
			TOPLAM	890.390,73

4) 2017H030740 Muhtelif ler (Bilgisayar Alım Projesi)

BA LAMA VE B T TAR H	YAPILAN İN ADI	2017 YILI YATIRIMLARINDA		
		F Z K GERÇEKLE ME		HARCAMA TUTARI
		HEDEF. M K TAR	GERÇEK. M K TAR	
2017-2017	Bilgisayar kasa, ve monitörü al,m, i i	% 100	% 100	64.977,58
2017-2017	Ekran Kart,, Kablosuz eri im cihaz, ve toner al,m, i i	% 100	% 100	92.093,55
2017-2017	Monitör ve Diz üstü Bilgisayar al,m, i i	% 100	% 100	25.652,11
2017-2017	MC Servis Bilgisayar Al,m, i i	% 100	% 100	97.196,60
2017-2017	Masaüstü ve Dizüstü ve bilgisayar, yaz,c, al,m, i i	% 100	% 100	138.040,53
2017-2017	Büro Mefru at Al,mlar,	% 100	% 100	61.911,00
2017-2017	Üniversitemiz birimlerine bilgisayar, evrak imha mak ve tv ve iç-d, ortam kamera al,m, i i	% 100	% 100	102.073,74
2017-2017	Galatasaray İlkokulu internet güvenli i için Cyberoam güvenlik cihaz, al,m, i i	% 100	% 100	17.110,00
			TOPLAM	599.055,11

5) 2017H030740 Muhtelif İşler (Taahhüt Alım Projesi)

BAĞLAMA VE BİTİRİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	2017 YILI YATIRIMLARINDA		
		FİZİK GERÇEKLEME		HARCAMA TUTARI
		HEDEF. MİKTAR	GERÇEK. MİKTAR	
2017-2017	Resmi Hizmet Araç Alım,	% 100	% 100	89.200,00
TOPLAM				89.200,00

6) 2017H030740 Muhtelif İşler (Mal Mamul Alım,)

BAĞLAMA VE BİTİRİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	2017 YILI YATIRIMLARINDA		
		FİZİK GERÇEKLEME		HARCAMA TUTARI
		HEDEF. MİKTAR	GERÇEK. MİKTAR	
2017-2017	GS.L SES YATAK ALIMI ve ÜNİVERSİTE TEMİZ BÜROLARINA PERDE YAPIMI	% 100	% 100	66.503,70
2017-2017	GS.L SES SİLİNDİRME KONU YASTIK VE NEVRESİM ALIMI	% 100	% 100	38.797,92
2017-2017	HAZIRLIK SINIFLARI SIRA VE SANDALYE ALIMI	% 100	% 100	16.562,99
2017-2017	GSL. BUZDOLABIÇAMA FIRIN, BULAĞIK, KURUTMA MAKİNELERİ .GSU ÇELİK DOLAP ALIMI	% 100	% 100	25.389,25
2017-2017	GSL.TURNİKEL GEÇİŞ SİSTEMİ KURULMASI	% 100	% 100	62.646,20
2017-2017	EL KURUTMA MAKİNESİ ALIMI	% 100	% 100	13.300,64
			TOPLAM	223.200,70

2017 YILI PPROJE G DERLER

- **2017H040060 Feriye Saraylar, Restorasyonu** : Proje Tutar, 10.000.000,00 TL’ d,r. 2017 y,l, Ba lang,ç ödene i 10.000.000,00 TL olup, proje kapsam,nda harcama yap,lmam, t,r.

2017H040060 Feriye Saraylar, Restorasyonu (Hizmet Binas,)

BA LAMA VE B T TAR H	YAPILAN N ADI	AÇIKLAMA (2017 Y,l,nda Tamamlanan lerle Nelerin Gerçekle tirildi i, Tamamlanmas, Programlanan Ancak Tamamlanamayan lerin Tamamlanamama Nedenleri Hakk,nda)	PROJEN N		2017 YILI YATIRIMLARINDA		HARCAMA TUTARI (TL)
			TOPLAM BÜYÜKLÜ Ü	MEVCUT F Z K DURUMU (2017 ÖNCES)	F Z K GERÇEKLE ME		
					HEDFLN. M KTAR	GERÇKL. M KTAR	
2017-2020	GSÜ Ortaköy Yerle kesi brahim Tevfik Efendi Sahil Saray, Güçlendirme, S,va, Ah ap ve Muhtelif Restorasyon Uygulama leri	Ortaköy Yerle kesi brahim Tevfik Efendi Sahil Saray, Güçlendirme, S,va, Ah ap ve Muhtelif Restorasyon Uygulama lerinin ihalesi yap,lm, olup i e ba lan,lm, t,r.					0
TOPLAM			0	0	0	0	0

2017 YILI PPROJE G DERLER

- **2017H030750 Yay,n Al,m** : Proje Tutar, 850.000,00 TL’ d,r. 2017 y,l, Ba lang,ç ödene i 850.000,00 TL. olup proje kapsam,nda 799.310,57 TL harcama gerçekte mi tir.

Veritaban, aboneliklerinin y,ll,k yap,lmam, ve yabanc, firmalar,n ödemelerini abonelik ba lang,c,nda talep etmelerinden dolayı, ödenek serbestliklerinin son üç ayl,k dilime kalmadan yap,lm, olmas, önemlidir.

Ödemelerin büyük ço unlu unun yurtd, na döviz kuru üzerinden yap,lmam, ve döviz kurlar,ndaki ani de i iklikler ödenek s,k,nt,s,na sebep olabilece i dü ünülmektedir.

2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2017 YILINDA YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞMESİNİ GÖSTEREN CETVEL								
Proje No	Projenin Adı,	Bütçe Ödeneği	Düzeltilen Ödenek	Eklenecek Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Kalan	Gerçekleşme Oranı,
2017H030730	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri	98.000,00		400.000,00	498.000,00	322.140,00	175.860,00	0,65
1996H030460	Derslik ve Merkezi Birimler	200.000,00			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2013H031020	Kampüs Altyapısı, Projesi	3.750.000,00	870.000,00		2.880.000,00	2.647.625,00	232.375,00	0,92
2017H030750	Yayın Alımı, Projesi	850.000,00			850.000,00	799.310,57	51.000,00	0,94
2017H030740	Muhtelif İşler/Büyük Onarım	6.029.000,00	400.000,00	10.530.000,00	16.159.000,00	15.953.575,65	205.424,35	0,99
	Muhtelif İşler/ Mak.Teç.Alımı,	600.000,00		631.000	1.231.000,00	1.230.111,02	888,98	1,00
	Muhtelif İşler/Mal Mamul Alımı,	0,00		300.000,00	300.000,00	223.200,70	76.799,30	0,74
	Muhtelif İşler/Bilgisayar Alımı,	600.000,00			600.000,00	599.055,11	944,89	0,89
	Muhtelif İşler/ Taahhüt Alımı,	71.000,00		19.000,00	90.000,00	89.200,00	800,00	0,99
	Muhtelif İşler/Yazılım Alımı,	300.000,00		608.000,00	908.000,00	890.390,73	17.609,27	0,98
2017H040060	Feriye Sarayı, Restorasyonu	10.000.000,00			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	Kamulaştırma	2.000,00			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	YATIRIMLAR TOPLAMI	22.500.000,00	1.270.000,00	12.488.000,00	33.718.000,00	22.754.608,78	10.963.391,22	0,67

2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2017 YILI YATIRIMLARI REVİZE CETVELİ

SEKTÖRÜ : YÜKSEKÖĞRETİM
PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ : GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

(Bin TL.)

2017 YILI PROGRAMI						AKTARMA		LİKİT	2017 YILI REVİZE PROGRAMI		
PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	2016 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2017 YILI YATIRIMI	EKLENEN	DÜŞÜLEN	EKLENEN	BİTİŞ YILI	TOPLAM PROJE TUTARI	2017 YILI TOPLAM YATIRIM GERÇEKLEŞME
2017H030740	Muhtelif ler	2017-2017	7.600	0	7.600	+570 +300	-400	+11.218	2017	19.288,0	18.986,0
2013H031020	Kampüs Altyap,s,	2013-2018	9.750	0	3.750		-570 -300		2018	2.880,0	2.648,0
1996H030460	Derslik ve Merkezi Birimler	1996-2018	68.000	59.408	200				2018	200,0	0,00
2017H030730	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2017-2017	98	0	98	+400			2017	498,0	322,00
	Kamulaştırma	2017-2017	2	0	2					2,0	0,0
2017H030750	Yayın Alım	2017-2017	850	0	850				2017	850,0	799,0
2017H040060	Feriye Saray, Restorasyonu	2017-2018	25.000	0	10.000				2018	10.000,0	0,00
TOPLAM			111.300,0	59.408,0	22.500,0	1.270,0	1.270,0	11.218,0		33.718,0	22.755,0

Not :

- 1) 2017 Yılı Yatırım Programı kapsamında, görülen Muhtelif İler Projesinden **400.000,00 TL** nin düz olarak Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine aktarılması,
- 2) Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı, 06.5.7 Hizmet Binası, Ödenek tertibinden (**Kampüs Altyapı, Projesi**) dari Mali İler 06.1 Mamul Mal Alımı, (**Muhtelif İler Projesi**) Ödenek tertibine **570.000,00 TL** aktarma yapılmıştır,
- 3) Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı, 06.5.7 Hizmet Binası, Ödenek tertibinden (**Kampüs Altyapı, Projesi**) dari Mali İler 06.1 Mamul Mal Alımı, (**Muhtelif İler Projesi**) Ödenek tertibine **300.000,00 TL** aktarma yapılmıştır,
- 4) Yapı İleri ve Teknik Daire Başkanlığı, 06.7 Hizmet Binası, Ödenek tertibine **10.530.000,00 TL** (**Muhtelif İler Projesi**) likit karı, olarak ödenek kaydı yapılmıştır,
- 5) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, 06.1 Mamul Mal Alımı, (**Muhtelif İler Projesi**) Ödenek tertibine **300.000,00 TL** likit karı, olarak ödenek kaydı yapılmıştır,
- 6) dari ve Mali İler Daire Başkanlığı, 06.1 Mamul Mal Alımı, (**Muhtelif İler Projesi**) Ödenek tertibine **150.000,00 TL** likit karı, olarak ödenek kaydı yapılmıştır,
- 7) dari ve Mali İler Daire Başkanlığı, 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları, (**Muhtelif İler Projesi**) Ödenek tertibine **238.000,00 TL** likit karı, olarak ödenek kaydı yapılmıştır,

2017 YILI HARCAMALARI YIL SONU GERÇEKLE ME RAPORU

Kurulu Adı : Galatasaray Üniversitesi
Sektör Adı : E itim

Yıl ç i Kümülatif Nakdi (1.000 TL)

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Biti Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Di (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2016 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Di Kredi (11)	Ödenek Di Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma (L K T) Mikt.(15)	Harcama Di Kredi (16)	Harcama Di Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
314436	442,	1996H030460	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2018	istanbul	0,	68.000,	59.408,	0,	0,	200,					0,
314439	442,	2013H031020	Kampüs Altyapı ² s ²	ÖZEL BÜTÇE	2018	istanbul	0,	9.750,	0,	0,	0,	3.750,	-870				2.648,
314430	442,	2017H030730	Çe itli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2017	istanbul	0,	98,	0,	0,	0,	98,	+400				322,
314433	442,	2017H030740	Muhtelif ler	ÖZEL BÜTÇE	2017	istanbul	0,	7.600,	0,	0,	0,	7.600,	+870 -400	+11.218,			18.986,
314442	442,	2017H030750	Yayın Alın ² m ²	ÖZEL BÜTÇE	2017	istanbul	0,	850,	0,	0,	0,	850,					799,
306018	442,	2017H040060	Feriye Saray ² Restorasyonu	ÖZEL BÜTÇE	2018	istanbul	0,	25.000,	0,	0,	0,	10.000,					0,
			Kamula tırma	ÖZEL BÜTÇE	2018	istanbul	0,	2,	0,	0,	0,	2,					0,
TOPLAM							0,	111.300,0	59.408,0	0,	0,	22.500,0	0,	11.218,			22.755,

