

**T.C.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ**



**2018 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU**



1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Galatasaray Üniversitesi, Atatürk ilkelerine saygılı, araştırmacı, sorgulayıcı, girişimci, çözümleyici, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiş, mesleki bilgileri üst düzeyde nitelikli bireyler yetiştirmek üzere uygulamalı ve kaliteli eğitim öğretim vermeyi temel amaç edinmiştir.

Üniversitemiz bu temel amacına erişmek için en son teknolojiye makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli, eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim imkanı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalışmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığına (Strateji Bütçe Başkanlığı) gönderilmek üzere hazırlanan Üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine sunarız.

2. GENEL DEĞERLENDİRME

1. Misyon

“Toplumsal gelişime katkıda bulunmak için, uluslararası işbirliklerini ve disiplinler arası çalışmaları destekleyen köklü bir eğitim ortamında sorgulayıcı, araştırmacı, çağdaş değerlerle donanmış nitelikli bireyler yetiştirmektedir.”

2. Vizyon

“Bilime katkıları ve eğitimde işbirlikleri ile öncü, mezunlarıyla toplumun geleceğinde söz sahibi, uluslararası bir araştırma üniversitesi olmaktır.”

3. Temel Değerler

- Bilgiyi toplumsal gelişim için üretmek, kullanmak ve yaymak
- Sürekli iyileştirme ile her alanda mükemmeliyet arayışı
- Öğrenci ve çalışan odaklılık
- Uluslararası işbirliği ve paydaşlarla güçlü ve sürekli ilişkiler
- Akademik özgürlük ve farklılıklara saygı
- Eğitim ve araştırmada evrensel etik değerlere bağlılık
- Yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik
- Toplumsal ve çevresel duyarlılık

3. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ

STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
<u>Stratejik Amaç 1:</u> Üniversitenin nitelikli öğrenciler tarafından öncelikli tercih edilirliliğinin artırılması	<u>Hedef 1.1:</u> Kabul edilen öğrenci niteliğinin artırılması <u>Hedef 1.2:</u> Öğrenci bağlılığının artırılması <u>Hedef 1.3:</u> Mezunlarla işbirliğinin artırılması
<u>Stratejik Amaç 2:</u> Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Artırılması	<u>Hedef 2.1:</u> Eğitim programlarının geliştirilmesi <u>Hedef 2.2:</u> Akademik personelin üst düzey yetkinliğinin korunması
<u>Stratejik Amaç 3:</u> Bilimsel araştırmaların niteliğinin, çeşitliliğinin ve yaygınlığının artırılması	<u>Hedef 3.1:</u> Bilimsel araştırma çıktılarının niteliğinin artırılması <u>Hedef 3.2:</u> Disiplinler arası çalışmaların artırılması

	<u>Hedef 3.3:</u> Bilimsel arařtırmaların yaygınlařtırılması
<u>Stratejik Amaç 4:</u> Bilimsel arařtırma sayısının artırılması	<u>Hedef 4.1:</u> Bilimsel arařtırma projelerine katılımın artırılması <u>Hedef 4.2:</u> Arařtırma bütçe ve imkanlarının çeřitlendirilmesi
<u>Stratejik Amaç 5:</u> Kurumsallařma faaliyetlerinin pekiřtirilmesi	<u>Hedef 5.1:</u> Kalite güvence sisteminin kurulması ve yaygınlařtırılması <u>Hedef 5.2:</u> Teknoloji altyapısının güçlendirilmesi
<u>Stratejik Amaç 6:</u> Kurum ii ve dıřı paydařlarla olan iletiřim ve iřbirlięi faaliyetlerinin artırılması	<u>Hedef 6.1:</u> Kurum ii birimlerde iletiřim ve iřbirlięinin artırılması <u>Hedef 6.2:</u> Dıř paydařlarla olan iletiřim ve iřbirlięinin artırılması
<u>Stratejik Amaç 7:</u> Toplumsal geliřime katkıda bulunan alıřmaların artırılması	<u>Hedef 7.1:</u> Toplumsal geliřime katkı alıřmalarının yaygınlařtırılması <u>Hedef 7.2:</u> Toplumsal ve evresel duyarlılık projelerinin artırılması

4. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI:

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

- A) Özel Bütçe
 - a) Hazine Yardımı
 - b) Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri (Lojman, kantin vb.)
 - 2) İkinci Öğretim Gelirleri
 - 3) Örgün Öğretim Gelirleri
 - 4) Öğrenci Telafi Giderleri
 - 5) Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
 - 6) Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
- B) Döner Sermaye
- C) Bütçe Dışı Kaynak
 - a) TÜBİTAK
 - b) AB
 - c) Erasmus
 - d) Santez Projeleri
 - e) Mevlana

5. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI:


Anayasa'nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesinde "Yükseköğretim paralıdır." hükmü yer almaktadır.

2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını "...her yıl bütçeye konulacak ödenekler..", 46 ncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda basılan süreli ya da süresiz yayınlar ile elektronik ortamda veya internet ortamında sunulan ders elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafî hâsılatın %5'inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı Kanunun Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim

kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı Kanunun Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği “Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi” için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, sayılabilir.

6. ÜNİVERSİTEMİZ 2018 YILI 06. SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK KODLU ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI


2018 YILI YATIRIM HARCAMALARININ BÜTÇE ÖDENEK DAĞILIMLARI						
	Kurum Başlangıç Ödeneği	Eklene Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek	Gerçekleşen Harcama Toplamı	Gerçekleşme Oranı
06. SERMAYE GİDERLERİ	24.500.000,00	12.010.436,47	2.815.200,00	33.695.236,47	32.345.895,92	0,96
06.1 Mamul Mal Alımı	2.500.000,00	50.000,00	200.000,00	2.350.000,00	2.229.860,65	0,99
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	500.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00	699.529,30	0,99
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	5.050.000,00	0,00	2.615.200,00	2.434.800,00	2.428.351,69	0,99
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	16.450.000,00	11.760.436,47	0,00	28.210.436,47	26.988.154,28	0,96

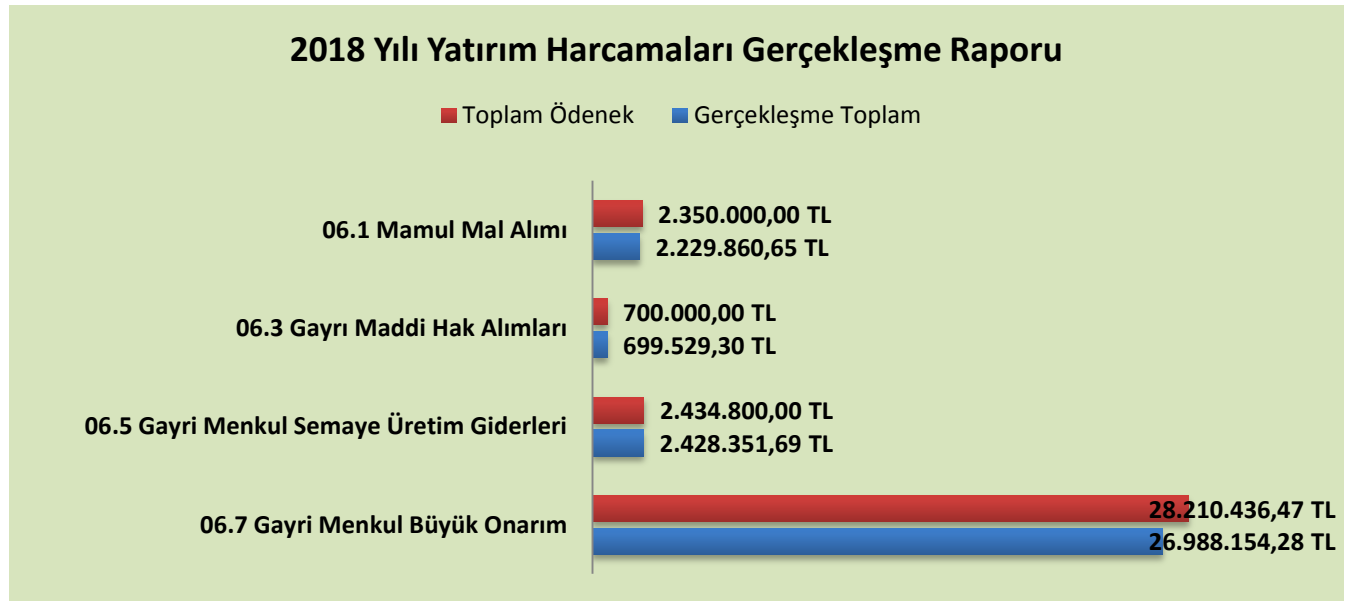

2018 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU					
	Kurum Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Kesin Harcama	Kalan Ödenek	Gerçekleşme Oranı
01 - Personel Gideri	42.640.000,00	47.927.872,58	46.712.973,78	1.214.898,80	0,97
02 - Sos.Güv.Kur.D. Prim Giderleri	6.136.000,00	7.115.500,00	6.996.176,33	119.323,67	0,98
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.036.000,00	13.217.234,22	12.906.795,67	310.438,55	0,98
05 - Cari Transferler	2.499.000,00	2.601.150,00	2.561.664,12	39.485,88	0,98
06 - Sermaye Giderleri	24.500.000,00	33.695.236,47	32.345.895,92	1.349.340,55	0,96
Toplam	91.811.000,00	104.556.993,27	101.523.505,82	3.033.487,45	0,97

BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN GİDER KALEMLERİNE DAĞILIMI

KURUM BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNİN GİDER KALEMLERİNE DAĞILIMI

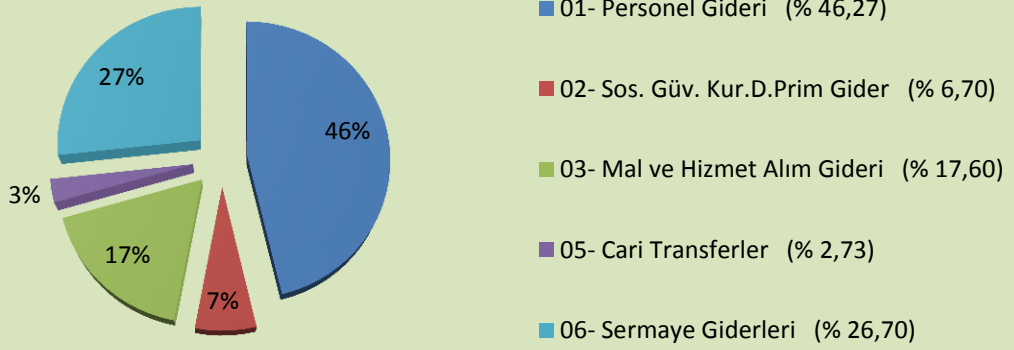

SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE ÖDENEĞİNİN TOPLAM BÜTÇE ÖDENEKLERİ İÇİNDEKİ PAYI



7. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

ORTAKÖY KAMPÜS ALANI 2018 YILI FİZİKİ KAPALI ALANLAR (M ²)										
Birimler	İdari Bina Alanları	Eğitim Alanları		Sosyal Alanlar				Spor Alanları		Toplam
		Derslik	Laboratu ar	Y.hane	Lojman	Yurtlar	Garaj	Açık	Kapalı	
Rektörlük	10.115,55	-	-	843,00	-	-	-	-	-	10.958,55
Fakülteler	8.648,85	3.178,45	827,00	-	-	-	-	-	-	12.654,30
Yüksekokullar	62,64	137,95	-	-	-	-	-	-	-	200,59
Enstitüler	414,54	120,60	-	-	-	-	-	-	-	535,14
Kütüphane	278,52	1.813,00	-	-	-	-	-	-	-	2.026,15
Sosyal Tesisler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atölye-Depo	1.018,46	-	-	-	-	-	-	-	-	1.018,46
TOPLAM	20.538,56	5.184,63	827,00	843,00	-	-	-	-	-	27.393,19

ENSTİTÜ, FAKÜLTE, MYO, VE TÜM BİRİMLER	MEVCUT FİZİKİ ALANLAR m ²									
	İDARİ BİNALAR	EĞİTİM ALANLARI		SOSYAL ALANLAR			SPOR ALANLARI			TOPLAM
		DERSLİK	LABORA TUVAR	KANTİN KAFFE VS	LOJMA N	YATAK HANE	SİRKÜLAS YON ALANI	AÇIK SPOR TESİSLERİ	KAPALI SPOR TESİSLERİ	
ORTAKÖY KAMPÜSÜ	16.020,43	6.321,57	827,00	843,00	-	-	3.381,00	-	-	27.393,00
BEYOĞLU KAMPÜSÜ	9.684,81	6.000,00	960,00	326,00	624,00	2.573,80	6.000,00	(4.865,00)	1.638,00	27.806,61
SİŞLİ KAMPÜSÜ	1.122,74	519,00	-	13,26	-	-	300,00	-	45,00	2.000,00
İLKÖĞRETİM OKULU BAHÇEŞEHİR	1.750,00	4.900,00	800,00	1.650,00	-	-	11.550,00	-	5.850,00	26.500,00
TOPLAM	28.577,98	17.740,57	2.587,00	2.832,26	624,00	2.573,80	21.231,00	4.865,00	7.533,00	83.699,61

Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Lisesi Beyoğlu kampüsünde, yukarıdaki tabloda belirtilen alanlar içerisinde; 1.887 m²'lik "Galatasaray Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi" bulunmaktadır.

6 Haziran 1994 tarihli ve 21952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı Kanununun 5. maddesinin geçici 29. maddesinde,"Galatasaray Lisesi'ne ayrılmış bulunan taşınır ve taşınmaz mallar Galatasaray Üniversitesi'ne devredilmiş sayılır." Hükmü yer

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

almaktadır. Bu nedenle tüm bakım ve onarım işlemleri ile yeni işlemlere ait yatırımlar üniversite bütçesinden harcanmaktadır.

Galatasaray Üniversitesi'nin diğer fiziksel değerleri aşağıda gösterilmiştir.

Galatasaray Üniversitesi Derslik Sayısı : 119

Taşıt aracı sayısı : 7'dir.

Hizmet satın alma yolu ile 3 adet araç kiralanmıştır.

Galatasaray Üniversitesi 2018 Yılı Sonu Mevcut Taşıt Listesi

Sıra No.	Taşıtın Cinsi	Plakası	Modeli	Markası	Sayı			
					Bütçe	Döner Sermaye	Fon	Hibe
1	BİNEK	34 GSU 98	2008	RENAULT	1			
2	BİNEK	34 GS 0954	2008	RENAULT	1			
3	AMBULANS	34 GS 0516	2009	BMC	1			
4	BİNEK	34 GS 0292	2015	FİAT	1			
5	MİNİBÜS	34 TA 5385	2015	FORD				1
6	MİNİBÜS	34 GD 0614	2015	KARSAN				1
7	BİNEK	34 BU 1671	2017	RENAULT	1			
TOPLAM					5	0	0	2

Üniversitemizde, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığının e-bütçe sistemi kullanılmaktadır. Ödemelerde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün MYS sistemi ile KBS sistemi kullanılarak kurumumuz personeli maaş ödemeleri ve diğer ödemeler yapılmaktadır. Ayrıca yatırım projeleri ve harcamaları da elektronik ortamda takip edilmektedir.

8. 2018 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemiz yerleşkelerinde yapılan çalışmalar projelendirme, bakım, onarım ve restorasyon niteliğinde olup, mekanlarımızın ilgili mevzuat çerçevesinde iyileştirilmesi yapılmaktadır.

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi; Yıldız Mahallesi, Çırağan Caddesi 65 pafta, 575 ada, 37 parselde yer alan Galatasaray Üniversitesi Tevfik Efendi Sahil Sarayı ile ilgili olarak İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayı ile restorasyon uygulama çalışmalarına başlanmıştır.

Ortaköy Yerleşkesi Rektörlük, Yabancı Diller ve Sosyal Bilimler Binaları Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat, Mühendislik, Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği projeleri hazırlanarak İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayına sunulmuştur.

2018 yılında aşağıda belirtilen işlerin ihalesi yapıлып, bütünüyle tamamlanmıştır;

- GSÜ Beyoğlu Yerleşkesi Tarihi Yapıların Acil Çatı Onarımları ve Müteferrik İşleri
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Tarihi Tescilli Duvarları ile Sosyal Bilimler Binası Restorasyon Projeleri Uygulaması, Çoskun Kırca Binası Öğrenci Yemekhanesi ve Müteferrik İşleri.
- GSÜ Yiğit Okur Binası Engellerler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Uyarıcı ve Kılavuz Yüzey Yapım İş.
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Bilgisayar Ağ Altyapısı Kurulumu İş.
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Muhtelif Doğramaları Yapım İş.
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Muhtelif Mekanların Elektrik Tesisatlarının Yapım İş.
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Yabancı Diller Binası Dış Cephe Demir Parmaklıklarının Boyanması İş.
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Sahil Sarayı Güçlendirme, Sıva, Ahşap ve Muhtelif Restorasyon Uygulama İşleri. (Devam Ediyor)
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Sahil Sarayı Elektrik ve Mekanik Malzeme Teçhizat Alım İş.
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Sahil Sarayı İç Tefrişatının, Aydınlatmalarının ve Konferans Salonlarının Yapılması İş. (Devam Ediyor)
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Sahil Sarayı Çevre Düzenlemesi İş.
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Rektörlük, Yabancı Diller ve Sosyal Bilimler Binaları Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat Mühendisliği, Makine

Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği Projeleri Hazırlanması İşi. (devam Ediyor)

- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Çevre Düzenleme ve Altyapı Hatları projelerinin Hazırlanması İşi.
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Öğrenci Yemekhanesi ve Kafeteryası İç Mimarlık, Makine Mühendisliği Projelerinin Hazırlanması İşi.
- GSÜ Bahçeşehir Yerleşkesi Mimari Avan Projeleri Hazırlanması İşi.
- GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Doğalgaz Projesi Hazırlanması İşi.

9. 2018 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

Genel Yatırım Uygulama Durumu :

Üniversitemizin 2018 yılında toplam 6 adet yatırım projesi mevcuttur.

- 1- 1996H030460 Derslik ve Merkezi Birimler (Üniversite, İlköğretim Okulu ve Lise Yerleşkesinin ve inşaat işlerini projelerinin yapılması)
- 2- 2018H034290 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (Üniversite, İlköğretim Okulu ve Lise Yerleşkelerinin rölöve, restitüsyon, restorasyon, mühendislik ve mimarlık projelerinin yapılması)
- 3- 2013H0301020 Kampüs Altyapısı Projesi (Üniversite Yerleşkesinin bilgisayar ağı altyapısı, kanal, elektrik, su, çevre düzenleme, doğalgaz, yol, ısı merk. art. trafo, telefon ve çevre güvenlik işleri)
- 4- 2018H034170 Muhtelif İşler Projesi (Üniversite, İlköğretim Okulu ve Lise Yerleşkesinin büyük onarım işleri - bilgisayar, makine ve teçhizat alımları ve bilgisayar yazılım alımları)
- 5- 2018H034780 Yayın Alımı (sürelili ve süresiz yayınlar ve elektronik kitap yayın alımları)
- 6- 2017H040060 Feriye Sarayı Restorasyonu

2018 yılında Üniversitemiz yatırım programında yer alan projelerin toplam proje tutarı 24.500.000,00 TL'dir. (06 Sermaye Giderleri) Yıl içerisinde 9.195.236,47 likit Karşılığı ödenek eklenerek genel toplamda 33.695.236,47 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin 32.345.895,92 TL'lik kısmı harcanmıştır.

2018H034170 proje nolu Muhtelif İşler ödeneğine 50.000,00 TL Likit karşılığı ödenek eklenmiştir. (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 06.1 Mal Mamul Alımları ödenek tertibine)

2018H03170 proje nolu Muhtelif İşler ödeneğine 7.700.000,00 TL Likit karşılığı ödenek eklenmiştir. (Yapı ve Teknik İşleri Daire Başkanlığı 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ödenek tertibine)

2018H04060 proje nolu Feriye Sarayı ödeneğine 1.445.436,47 TL Likit karşılığı ödenek eklenmiştir. (Yapı ve Teknik İşleri Daire Başkanlığı 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ödenek tertibine)

2013H0301020 Kampüs Altyapısı Projesi ödeneğinden 2018H034170 proje nolu Muhtelif İşler ödeneğine 2.000.000,00 TL aktarma yapılmıştır. (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 06.5 ödenek tertibinden, 06.7 ödenek tertibine yapılan aktarma)

2018H034290 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ödeneğinden 2018H034170 proje nolu Muhtelif İşler ödeneğine 365.200,00 TL aktarma yapılmıştır. (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 06.5 ödenek tertibinden, 06.7 ödenek tertibine yapılan aktarma)

1996H030460 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ödeneğinden 2018H034170 proje nolu Muhtelif İşler ödeneğine 250.000,00TL aktarma yapılmıştır. (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 06.5 ödenek tertibinden, 06.7 ödenek tertibine yapılan aktarma)

2018H034180 Yayın Alım Projesi ödeneğinden 2018H034170 proje nolu Muhtelif İşler ödeneğine 150.000,00TL aktarma yapılmıştır. (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 06.1 ödenek tertibinden, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 06.3 ödenek tertibine yapılan aktarma)

2018H034170 Muhtelif İşler Projesi ödeneğinden 2018H034170 proje nolu Muhtelif İşler ödeneğine 50.000,00TL aktarma yapılmıştır. (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 06.1 ödenek tertibinden, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 06.3 ödenek tertibine yapılan aktarma)

Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar :

Üniversitemiz Ortaköy ve Beyoğlu (Galatasaray Lisesi-Galatasaray Ortaokulu) Yerleşkelerinde bulunan binalar tarihi eser niteliğinde olup, restorasyon çalışmaları için gerekli izin ve bürokratik işlemlerden kaynaklanan gecikmeler yaşanmaktadır. Bu da yıllık hedeflerimizin özellikle Etüt Proje ve Muhtelif İşler kısmında sarkmasına yol açmaktadır.

10. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

2018H034290 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi : Proje Tutarı 2.800.000,00 TL' dir. 2018 yılı Başlangıç ödeneği 800.000,00 TL olup yıl içerisinde 2018H034170 Muhtelif İşler Projesine 365.000,00 TL revize (Düşülen) yapılmıştır. Proje kapsamında toplam 434.152,00 TL harcama yapılmıştır.

1996H030460 Derslik ve Merkezi Birimler : Proje Tutarı 6.798.000,00 TL' dir. 2018 yılı Başlangıç ödeneği 250.000,00 TL olup, yıl içerisinde 2018H034170 Muhtelif İşler Projesine 250.000,00 TL revize (Düşülen) yapılmıştır. Proje kapsamında harcama yapılmamıştır.

Galatasaray Eğitim Vakfına bağışlanan ve 49 yıl müddetle Galatasaray Üniversitesine irtifak hakkı (başlama tarihi 31.03.2003) verilen Bahçeşehir Yerleşkesi parsellerin üzerinde yapılmakta olan Yönetim Binası Yapım İşinin iş programı, Galatasaray Eğitim Vakfına bağışçısı tarafından açılan dava nedeniyle 2018 yılında gerçekleştirilememiştir.

2013H031020 Kampüs Altyapısı : Proje Tutarı 12.250.000,00 TL' dir. 2018 yılı Başlangıç ödeneği 4.000.000,00 TL olup yıl içerisinde 2018H034170 Muhtelif İşler Projesine 2.000.000,00 TL revize (Düşülen) yapılmıştır. Proje kapsamında toplam 1.994.200,00 TL harcama yapılmıştır.


2018H034180 Yayın Alım : Proje Tutarı 1.200.000,00 TL' dir. 2018 yılı Başlangıç ödeneği 1.200.000,00 TL. olup yıl içerisinde 2018H034170 Muhtelif İşler Projesine 150.000,00 TL revize (Düşülen) yapılmıştır. Proje kapsamında toplam 984.072,62 TL harcama yapılmıştır

2018H034170 Muhtelif İşler : Proje Tutarı 6.250.000,00 TL' dir. 2018 yılı Başlangıç ödeneği 6.250.000,00 TL' dir. Yıl içerisinde 2018H034180 Yayın Alım Projesinden 150.000,00 TL, 2017H030730 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 365.200,00 TL, 1996H030460 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 250.000,00 TL, 2013H031020 Kampüs Altyapısı Projesinden 2.000.000,00 TL revize (Eklenen) yapılmış ayrıca Likit karşılığı 7.750.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Genel Toplamda proje ödeneği 16.765.000,00 TL olup bu kapsamında 16.415.000,00 TL harcama yapılmıştır.

2017H040060 Feriye Sarayları Restorasyonu : Proje Tutarı 51.732.000,00 TL' dir. 2018 yılı Başlangıç ödeneği 12.000.000,00 TL olup, yıl içerisinde 1.445.436,47 TL Likit Karşılığı ödenek eklenmiştir. Genel Toplamda proje ödeneği 13.445.436,47 TL olup bu kapsamında toplam 12.471.991,53 harcama yapılmamıştır.

2018 Yılı Kamu Yatırımları Proje Bazında Harcama Raporu

Bin TL

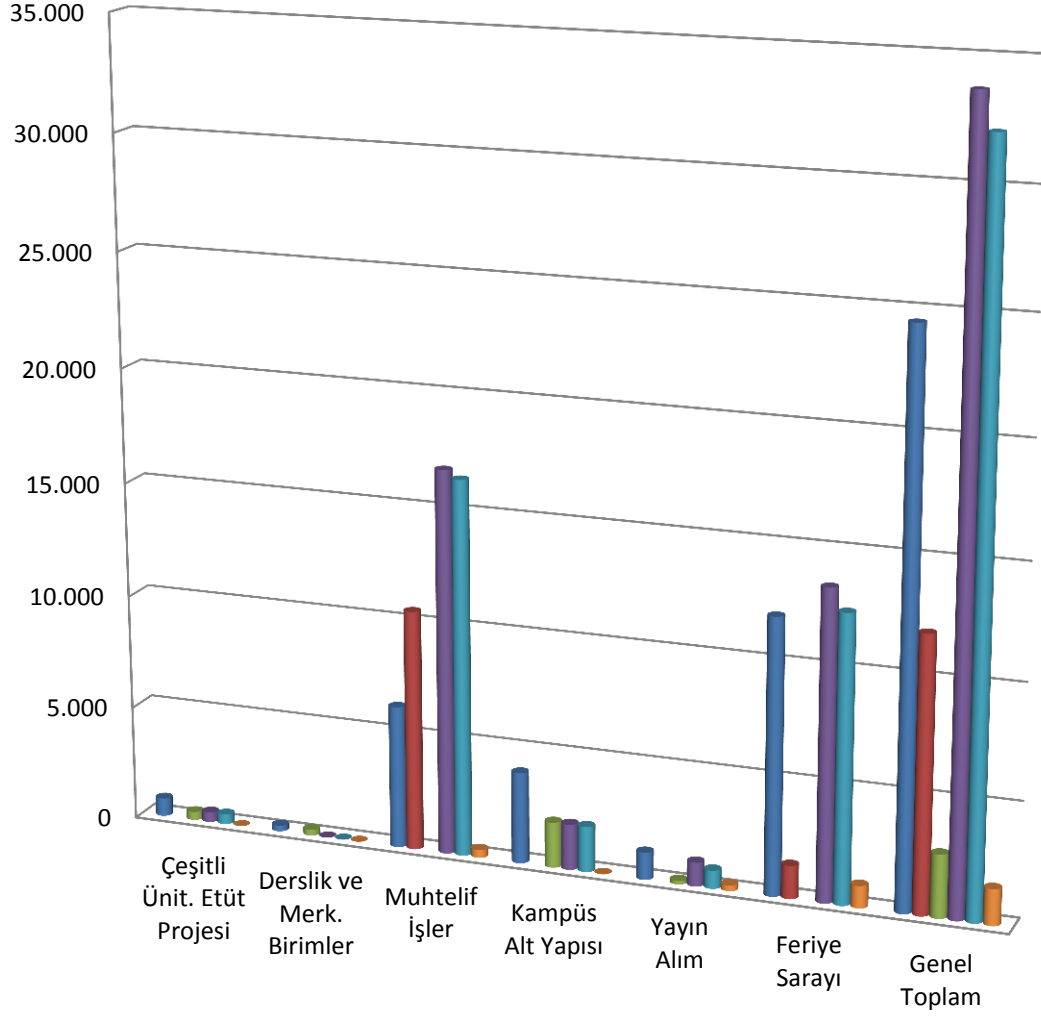

	Çeşitli Ünit. Etüt Projesi	Derslik ve Merk. Birimler	Muhtelif İşler	Kampüs Alt Yapısı	Yayın Alım	Feriye Sarayı	Genel Toplam
■ Başlangıç Ödeneği	800	250	6.250	4.000	1.200	12.000	24.500
■ Eklene			10.515			1.446	11.961
■ Düşülen	365	250		2.000	150		2.765
■ Toplam Ödenek	435	0	16.765	2.000	1.050	13.446	33.696
■ Harcama	434	0	16.415	1.994	799	12.472	32.114
■ Kalan Ödenek	1	0	350	6	251	974	1.582

2018 YILI PPROJE GİDERLERİ

- 2018H034290 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi : Proje Tutar 2.800.000,00 TL' dir. 2018 yılı Başlangıç ödeneği 800.000,00 TL olup yıl içerisinde 2018H034170 Muhtelif İşler Projesine 365.000,00 TL revize (Düşülen) yapılmıştır. Proje kapsamında toplam 434.152,00 TL harcama yapılmıştır.

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2018 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2018 YILI YATIRIMLARINDA		
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2018 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI (TL)
					HEDEFLN. MİKTAR	GERÇKLMİ KTAR	
26.03.2018 09.05.2018	GSU Ortaköy Yer.Çevre Düz.ve Altyapı Hatları Projelerinin Haz.İşi	Ortaköy Yerleşkesinin Çevre Düzenlemesi ve Altyapı Hatlarının Projeleri Hazırlanmıştır.	193.520,00		193.520,00	193.520,00	193.520,00
09.09.2016 – Devam ediyor	GSÜ Ortaköy Yerl.Rek.Y.Diller ve Sos.Bil.Binaları Rölöve, Rest.Restr.İnş.Müh.Ma k.Müh.Elekt.Müh.Proje leri Haz.İşi	Rektörlük ve Sosyal Bilimler Binalarının tüm projeleri onaylanmıştır. Yabancı Diller Binasının Rölövesi onaylanmış olup, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri Anıtlar Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır.	584.690,00	203.550,0	434.200,00	271.901,69	68.352,00
23.03.2018 11.04.2018	GSÜ Ort. Yerl. Öğrenci Yem.ve Kaf.İç Mimarlık Mak.Müh.ve Elekt.Müh.Projelerinin Haz.İşi.	Ortaköy Yerleşkesi Öğrenci Yemekhane Ve Kafeterya İç Mimarlık ve Mühendislik Projeleri hazırlanmıştır.	76.700,00		76.700,00	76.700,00	76.700,00
07.12.2018 14.12.2018	GSÜ Bahçeşehir Yer.Mimari Avan Proje Haz.İşi	Bahçeşehir Yerleşkesi için Mimari etüt yapılmış ve Mimari Avan Projeler Hazırlanmıştır.	76.700,00		76.700,00	76.700,00	76.700,00
30.10.2018 05.11.2018	GSÜ Ortaköy Yerl.Doğalgaz Projesi Haz.İşi.	Ortaköy Yerleşkesinde yeni Kafeterya ve Yemekhane için yeni doğalgaz projeleri hazırlanıp İGDAŞ tarafından onaylatılmıştır.	18.880,00		18.880,00	18.880,00	18.880,00
TOPLAM			950.490,00	203.550,00	800.000,00	637.701,69	434.152,00

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

- **1996H030460 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:** Proje Tutarı 6.798.000,00 TL' dir. 2018 yılı Başlangıç ödeneği 250.000,00 TL olup, yıl içerisinde 2018H034170 Muhtelif İşler Projesine 250.000,00 TL revize (Düşülen) yapılmıştır. Proje kapsamında harcama yapılmamıştır.

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2017 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2017 YILI YATIRIMLARINDA		
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2017 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI (TL)
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL MİKTAR	
1996 - 2017	Derslik ve Merkezi Birimler (Yönetim Binası)	Galatasaray Eğitim Vakfına bağışlanan ve 49 yıl müddetle Galatasaray Üniversitesine irtifak hakkı (başlama tarihi 31.03.2003) verilen Bahçeşehir Yerleşkesi parsellerin üzerinde yapılmakta olan Yönetim Binası Yapım İşinin iş programı ve yapılması hedeflenen çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmaları da Galatasaray Eğitim Vakfına bağışçısı tarafından açılan dava nedeniyle 2017 yılında gerçekleştirilememiştir	2800m ²	2500m ²	2800m ²	0	0,00
		TOPLAM					

- **2013H031020 Kampüs Altyapısı :** Proje Tutarı 12.250.000,00 TL' dir. 2018 yılı Başlangıç ödeneği 4.000.000,00 TL olup yıl içerisinde 2018H034170 Muhtelif İşler Projesine 2.000.000,00 TL revize (Düşülen) yapılmıştır. Proje kapsamında toplam 1.994.200,00 TL harcama yapılmıştır.

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2017 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2018 YILI YATIRIMLARINDA		
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2018 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI (TL)
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL MİKTAR	
30.07.2018 27.09.2018	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Bilgisayar Ağ Altyapısı Kurulumu İşİ	Ortaköy Yerleşkesi Ağ Altyapısı için yeni depolama ünitesi, ağ bağdaştırıcıları sisteme entegre edilip, kablosuz internet ortamı genişletilmiştir.	1.994.200,00		1.994.200,00	1.994.200,00	1.994.200,00
		TOPLAM	1.994.200,00		1.994.200,00	1.994.200,00	1.994.200,00

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

- **2018H034170 Muhtelif İşler** : Proje Tutarı 7.600.000,00 TL’ dir. 2018 yılı Başlangıç ödeneği 7.600.000,00 TL’ dir. Yıl içerisinde 2017H030730 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 400.000,00 TL revize (Düşülen) ve 2013H031020 Kampüs Altyapısı Projesinden 870.000,00 TL revize (Eklenen) yapılmış ayrıca Likit karşılığı 11.218.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Genel Toplamda 19.288.000,00 TL olup proje kapsamında 18.985.533,21 TL harcama gerçekleşmiştir.

1) 2018H034170 Muhtelif İşler (Büyük Onarım - Hizmet Binası)

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2018 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2018 YILI YATIRIMLARINDA		
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2018 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI (TL)
					HEDFLN. MİKTAR	GERÇKL MİKTAR	
10.04.2018 06.09.2018	GSÜ Beyoğlu Yerleşkesi Tarihi Yapıların Acil Çatı Onarımları ve Müteferrik İşleri	Beyoğlu Yerleşkesinde Ana Bina, Giriş binası Lojman ve Yemekhane binalarının Acil çatı onarımları yapılmıştır.	3.928.220,00		3.928.220,00	3.917.781,89	3.917.781,89
08.06.2018 04.12.2018	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Tarihi Tescilli Duvarı İle Sosyal Bilimler Binası Restorasyon Projeleri Uygulaması, Coşkun Kırca Binası Öğrenci Yemekhanesi Yapımı ve Müteferrik İşleri	Ortaköy Yerleşkesi Tarihi Tescilli Duvarın güçlendirmesi ve restorasyonu, Sosyal Bilimler Binasının dış cephe restorasyonu, zemin katının Öğrenci işleri ofisine çevirilmesi ve restorasyonu, Coşkun Kırca binasındaki Öğrenci işleri ofisinin Öğrenci yemekhanesine dönüştürülmesi işleri yapılmıştır.	10.355.359,90		9.200.460,00	10.355.359,90	10.355.359,90
20.09.2018 24.09.2018	GSÜ Yiğit Okur Binası Engelliler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Uyarıcı ve Kılavuz Yüzey Yapımı İşi	Yiğit Okur Binası içerisi ve etrafında erişilebilirlik yönetmeliğine uygun olarak Uyarıcı ve Kılavuz Yüzeyler Yapılmıştır.	48.380,00		48.380,00	48.380,00	48.380,00
02.03.2018 08.03.2018	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Muhtelif Doğramaların Yapım İşi	Ortaköy Yerleşkesinde bulunan hasarlı doğramalar yeniden yapılmıştır.	64.192,00		64.192,00	64.192,00	64.192,00
27.02.2018 05.03.2018	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Muhtelif Mekanların Elektrik Tesisatlarının Yapımı İşi	Ortaköy Yerleşkesinde Muhtelif mekanlarda eskiyen elektrik tesisatları yenilenmiştir.	77.880,00		77.880,00	77.880,00	77.880,00
27.02.2018 05.03.2018	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Yabancı Diller Binası Dış Cephe Demir Parmaklıkların Boyanması İşi	Yabancı Diller Binasındaki tarihi dökme demir parmaklıklar temizlenip yeniden boyanmıştır.	52.569,00		52.569,00	52.569,00	52.569,00
		TOPLAM	14.526.600,90		13.371.701,00	14.516.162,79	14.516.162,79

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2) 2018H034170 Muhtelif İşler (Büro ve İşyeri Mefruşat Alımı)

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	2017 YILI YATIRIMLARINDA		
		FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI
		HEDEF. MİKTAR	GERÇEK. MİKTAR	
08.10.2018	Büro Mobilyaları Alımı	% 100	% 100	11.872,52
23.10.2018	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	% 100	% 100	2.735,06
30.11.2018	Büro Mobilyaları Alımı	% 100	% 100	28.036,70
03.10.2018	Eğitim Mobilyaları ve Donanımı	% 100	% 100	42.850,52
21.12.2018	Temizlik Araç ve Gereçleri	% 100	% 100	5.082,26
21.12.2018	Büro Mobilyaları Alımı	% 100	% 100	5.296,76
18.05.2018	Büro Mobilyaları Alımı	% 100	% 100	3.933,86
09.05.2018	Büro Mobilyaları Alımı	% 100	% 100	140.184,00
24.12.2018	Misafirhane Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilya Alımı	% 100	% 100	26.550,00
24.12.2018	Sofra Takım ve Çatal Bıçak Takımı	% 100	% 100	1.011,02
24.12.2018	İçecek Servis Takımları	% 100	% 100	2.462,09
24.12.2018	Beslenme Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	% 100	% 100	1.829,00
06.09.2018	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	% 100	% 100	26.479,20
12.09.2018	Mefruşat Ürünleri	% 100	% 100	27.258,00
19.12.2018	MYO Ekipmanları	% 100	% 100	673,19
TOPLAM				326.254,18

3) 2018H034170 Muhtelif İşler (Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları)

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	2017 YILI YATIRIMLARINDA		
		FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI
		HEDEF. MİKTAR	GERÇEK. MİKTAR	
05.03.2018	Büro Makineleri grup Yedek Parçaları	% 100	% 100	1.121,00
05.03.2018	Diğer Yedek Parçalar	% 100	% 100	1.012,44
05.03.2018	Bilgisayar Çevre Birimleri ve Sunucular	% 100	% 100	53934,61
23.03.2018	Yıkama Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	% 100	% 100	35.991,21
18.04.2018	Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları	% 100	% 100	23.309,72
18.04.2018	Haberleşme Cihazları	% 100	% 100	14.160,00

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

26.04.2018	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri			9.534,40
14.05.2018	Elektrik Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri	% 100	% 100	6.254,00
04.06.2018	Ses Görüntü ve Sunum Cihazları	% 100	% 100	139.308,44
08.08.2018	Bilgisayar ve Sunucular ve Çevre Birimleri	% 100	% 100	157.113,81
22.11.2018	Diğer Yedek Parçalar	% 100	% 100	13.068,50
30.11.2018	Bilgisayar ve Sunucular ve Çevre Birimleri	% 100	% 100	34.947,96
30.11.2018	Ses Görüntü ve Sunum Cihazları	% 100	% 100	43.618,72
24.12.2018	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	% 100	% 100	1.722,80
19.12.2018	Beslenme Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	% 100	% 100	46.138,47
19.12.2018	Haberleşme Cihazları	% 100	% 100	40.308,74
19.12.2018	MYO Ekipmanları	% 100	% 100	28.679,50
21.12.2018	Bilgisayar ve Sunucular ve Çevre Birimleri	% 100	% 100	156.745,34
21.12.2018	Yıkama Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	% 100	% 100	38.820,35
21.12.2018	Bilgisayar ve Çevre Birimleri	% 100	% 100	14.597,87
21.12.2018	Haberleşme Cihazları	% 100	% 100	1.594,53
24.12.2018	Diğer Büro ve Makineleri Ve Aletleri	% 100	% 100	1.722,80
			TOPLAM	855.705,21

4) 2018H034170 Muhtelif İşler (Diğer Makine Teçhizat Alımları)

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	2017 YILI YATIRIMLARINDA		
		FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI
		HEDEF. MİKTAR	GERÇEK. MİKTAR	
20.12.2018	Diğer Mefruşat Alımları	% 100	% 100	4.248,00
24.12.2018	Makine ve Alet Grubu Yedek Parçaları	% 100	% 100	12.637,80
TOPLAM				599.055,11

5) 2018H034170 Muhtelif İşler (Bilgisayar Yazılım Alımları)

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	2017 YILI YATIRIMLARINDA		
		FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI
		HEDEF. MİKTAR	GERÇEK. MİKTAR	
06.01.2018	İletişim Fakültesi Lisans Alımı	%100	%100	25.529,30
14.05.2018	Microsoft İşletim Sistemi Yazılım Alımı	%100	%100	133.340,00
13.12.2018	CBK Soft EDYS Yazılım Alımı	%100	%100	199.500,00
20.12.2018	Bilimsel Araştırma Proje Süreçleri Yazılımı	%100	%100	327.000,00
22.05.2018	Staj Takip Programı	%100	%100	14.160,00
TOPLAM				699.529,30

6) 2018H034170 Muhtelif İşler (Mal Mamul Alımı)

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	2017 YILI YATIRIMLARINDA		
		FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI
		HEDEF. MİKTAR	GERÇEK. MİKTAR	
20.06.2018	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Kart Yazıcı Alımı	%100	%100	4.602,00
20.06.2018	Sosyal Bilimler Enst. Müdürlüğü Kapısına Turnike Yapımı	%100	%100	11.800,00
20.06.2018	Üniversitemizin Giriş Kapılarındaki Turnikelere Koruyucu Kılıf Alımı	%100	%100	2.808,40
20.06.2018	Yemekhane Turnikelerine Terminal Alımı	%100	%100	7.740,80
20.06.2018	SKS Daire Başk.ve GS Lisesine Klima Alımı	%100	%100	1.073,80
20.06.2018	Çelik Dolap Alımı	%100	%100	18.917,84
			TOPLAM	223.200,70

- **2017H040060 Feriye Sarayları Restorasyonu** : Proje Tutarı 51.732.000,00 TL' dir. 2018 yılı Başlangıç ödeneği 12.000.000,00 TL olup, yıl içerisinde 1.445.436,47 TL Likit Karşılığı ödenek eklenmiştir. Genel Toplamda proje ödeneği 13.445.436,47 TL olup bu kapsamında toplam 12.471.991,53 harcama yapılmamıştır.

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	YAPILAN İŞİN ADI	AÇIKLAMA (2018 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak Tamamlanamayan İşlerin Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)	PROJENİN		2018 YILI YATIRIMLARINDA		
			TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ	MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2017 ÖNCESİ)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME		HARCAMA TUTARI (TL)
					HEDEFLN. MİKTAR	GERÇKL. MİKTAR	
20.12.2017 Devam Ediyor	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı Güçlendirme, Sıva, Ahşap ve Muhtelif Restorasyon Uygulama İşleri	İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı Binasının Güçlendirme, Sıva, Ahşap ve Muhtelif Restorasyon İşleri yapılmıştır. İş artışı sebebi ile yapılacak ek imalatlar 2019 yılına sarkmıştır.	13.403.593,10	0,00	8.998.614,89	6.211.091,47	6.211.091,47
07.08.2018 04.11.2018	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı Elektrik Ve Mekanik Malzeme Ve Teçhizat Alımı İşi	İbrahim Tevfik Sahil Sarayında uygulanacak Mekanik ve Elektrik Tesisat Projeleri için gerekli teçhizat alınmıştır.	4.867.795,87		4.867.795,87	4.817.339,07	4.817.339,07
13.12.2018 Devam Ediyor	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı İç Tefrişatın, Aydınlatmalarının ve Konferans Salonunun Yapılması İşi	İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayında Konferans salonu İç tefrişat ve Aydınlatma tesisatları yapılmaktadır. Proje 2019 tarihinde tamamlanmak üzere ihaleye çıkmış olup imalat süreci devam etmektedir.	4.029.820,01		0,00	0,00	0,00
18.07.2018 Devam ediyor	GSÜ Ortaköy Yerleşkesi İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı Çevre Düzenlemesi İşi	Ortaköy yerleşkesi İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı çevre düzenlemesi Yemekhane binası ve Rektörlük binası önündeki bölüm yapılmış olup, İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı binası restorasyonu tamamlanması süreci uzadığı için yapı çevresindeki imalatlar durdurulmuştur. Kalan imalatların restorasyon süreci akabinde 2019 yılında bitirilmesi öngörülmektedir.	2.324.577,58		2.324.577,58	1.443.560,99	1.443.560,99
TOPLAM			24.625.786,56	0	16.190.988,34	12.471.991,53	12.471.991,53

- **2018H034180 Yayın Alım** : 1.200.000,00 TL'dir. 2018 yılı Başlangıç ödeneği 1.200.000,00 TL. olup yıl içerisinde 2018H034170 Muhtelif İşler Projesine 150.000,00 revize (Düşülen) yapılmıştır. Proje kapsamında toplam 984.072,62 TL harcama yapılmıştır.

Veritabanı aboneliklerinin yıllık yapılması ve yabancı firmaların ödemelerini abonelik başlangıcında talep etmelerinden dolayı ödenek serbestliklerinin son üç aylık dilime kalmadan yapılmış olması önemlidir.

Ödemelerin büyük çoğunluğunun yurtdışına döviz kuru üzerinden yapılması ve döviz kurlarındaki ani değişiklikler ödenek sıkıntısına sebep olabileceği düşünülmektedir.

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2018 YILINDA YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞMESİNİ GÖSTEREN CETVEL								
Proje No	Projenin Adı	Bütçe Ödeneği	Düşülen Ödenek	Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek	Harcama	Kalan	Gerçekleşme Oranı
2018H034290	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri	800.000,00	365.200,00	0	434.800,00	434.152,00	648,00	0,999
1996H030460	Derslik ve Merkezi Birimler	250.000,00	250.000,00	0	0,00	0	0,00	0,000
2013H031020	Kampüs Altyapısı Projesi	4.000.000,00	2.000.000,00	0	2.000.000,00	1.994.200,00	5.800,00	0,997
2018H034180	Yayın Alımı Projesi	1.200.000,00	150.000,00	0	1.050.000,00	984.072,00	65.928,00	0,937
2018H034170	Muhtelif İşler-Büyük Onarım	4.450.000,00	0	10.314.000	14.764.000,00	14.516.163,00	247.837,00	0,983
	Muhtelif İşler-Büro ve İşyeri Mef. Alım	350.000,00	20.000,00		330.000,00	326.254,00	3.746,00	0,989
	Muhtelif İşler-Büro ve İşy. Mak. Teçh.	900.000,00	30.000,00		870.000,00	855.705,00	14.295,00	0,984
	Muhtelif İşler-Engelli Erişim Mal Alımı	50.000,00	0	0	50.000,00	16.886,00	33.114,00	0,338
	Muhtelif İşler-Bilgisayar Yazılım Alımı	500.000,00	0	200.000,00	700.000,00	699.529,00	471,00	0,999
	Muhtelif İşler-Mal Mamul Alımı	0	0	50.000,00	50.000,00	46.943,00	3.057,00	0,939
2018H040060	Feriye Sarayı Restorasyonu	12.000.000,00	0	1.446.436,00	13.446.436,00	12.471.992,00	974.444,00	0,928
	YATIRIMLAR TOPLAMI	24.500.000,00	2.815.200,00	12.010.436,00	33.695.236,00	32.345.896,00	1.349.340,00	0,960

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2018 YILI YATIRIMLARI REVİZE CETVELİ

SEKTÖRÜ : YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ : GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

(Bin TL.)

2018 YILI PROGRAMI						AKTARMA		LİKİT	2018 YILI REVİZE PROGRAMI		
PROJE NO	PROJE ADI	BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	2017 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA	2018 YILI YATIRIMI	DÜŞÜLEN	EKLENEN	EKLENEN	BİTİŞ YILI	TOPLAM PROJE TUTARI	2018 YILI TOPLAM YATIRIM GERÇEKLEŞME
2018H034170	Muhtelif İşler	2018-2018	6.250	0	6.250	-50	+2.000 +250 +150 +50 +365	+7.699 +50	2018	16.764	16.462
2013H031020	Kampüs Altyapısı	2013-2020	12.250	1.677	4.000	-2.000			2020	2.000	1.994
1996H030460	Derslik ve Merkezi Birimler	1996-2019	6.798	0	250	-250			2019	0	0
2018H034290	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2018-2020	2.800	0	800	-365			2020	435	434
2018H034180	Yayın Alım	2018-2018	1.200	0	1.200	-150			2018	1.050	984
2017H040060	Feriye Sarayı Restorasyonu	2017-2020	51.732	0	12.000			+1.447	2020	13.447	12.472
TOPLAM			81.030	1.677	24.500	2.815	2.815	9.196		33.696	32.346
